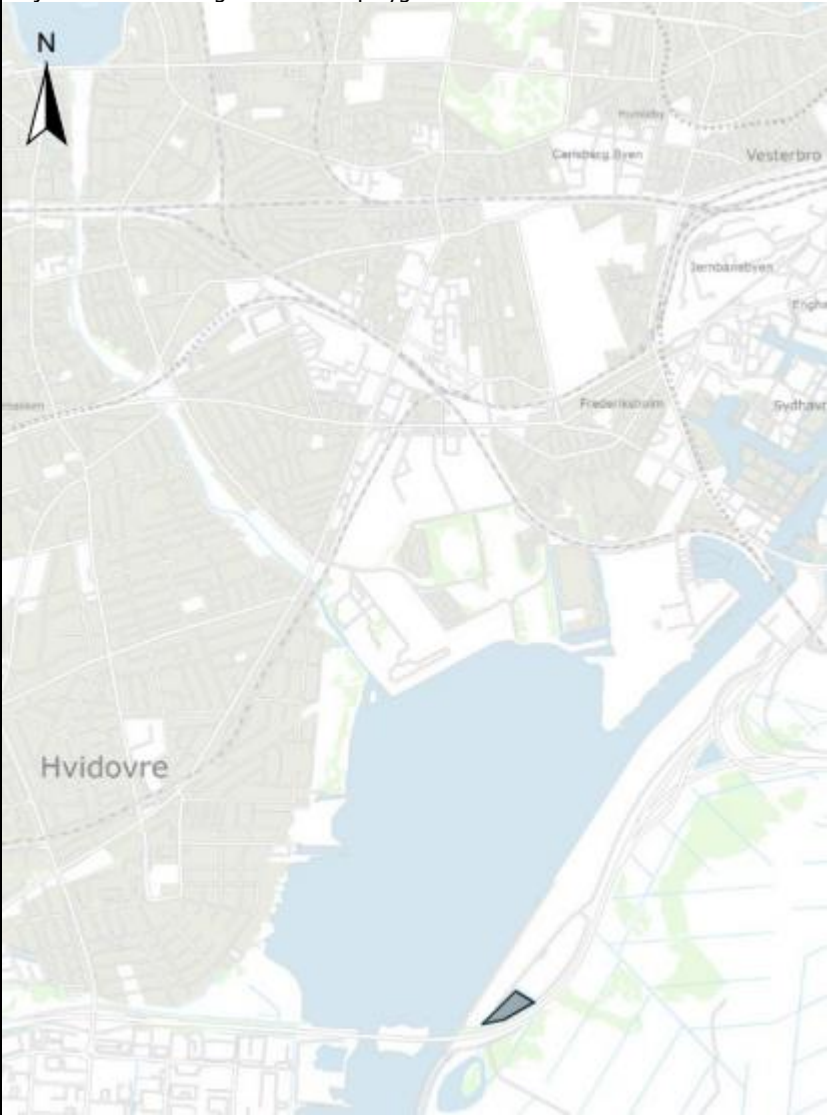


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	KMC ønsker at etablere en plads for kartering (dokumentation af forureningsgrad af jord ved prøvetagning) af udokumenteret jord samt nedknusning af bygge- og anlægsaffald (asfalt, brokker, tegl, beton) på en del af KMCs areal på den sydvestlige del af Selinevej. Arealet udgøres i dag af tre pladser Plads 1-Plads3. Pladsen etableres med tæt belægning og et afvandingssystem, som skal kunne håndtere perkolat og overfladevand fra de tre pladser. Plads 1 er i dag grusbelagt og i dag er oplagt rene grusmaterialer på pladsen. Plads 2 anvendes p.t. til andre formål, men skal ligeledes inddrages formentlig samtidig med Plads 1. Det nye afvandingssystem er derfor projekteret og planlagt, så der tilsvarende kan asfalteres på dette areal. Plads 3 er allerede asfalteret og har været anvendt til kortvarigt oplag af rene materialer. Når driften igangsættes, er det planlagt at karteringsanlægget skal modtage 235.000 tons affald om året, hvoraf 2/3 består af udokumenteret jord. Det forventes at 1/3 af det modtagne materiale vil bestå af brokker og byggeaffald, som dels ankommer med jorden og sorteres fra og dels modtages separat. Såvel jord som brokker og byggeaffald stammer fra Københavns Kommunes egne bygge- og anlægsprojekter Brokker og byggeaffald nedknuses på pladsen hvorefter det videresendes til nyttiggørelse. Nedknuseren planlægges at være mobil og denne aktivitet kan foregå på hele pladsen. På pladsen vil den udokumenterede jord oplagres i miler dimensioneret efter retningslinjerne i Jordflytningsbekendtgørelsen. Når jorden er karteret, vil den videredisponerestil godkendt modtager. Det er planlagt, at pladsen skal være åben mandag-fredag fra kl. 06.30-18.00 og lørdag fra kl. 06.30-14.00. Der vil på pladsen altid være en ansat til stede til at vurdere, om jorden og byggeaffald kan modtages.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kalvebod Miljøcenter Nordhavn (KMC) Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn kmc@tmf.kk.dk 33663060
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Jakobsen Nordsøvej 4, 2150 København Tlf.: 33663069 e-mail: marja@kk.dk
Projektets adresse, matr.	KMC, Selinevej, Selinevej, Del af matr. Nr. 917, Sundby overdrev København

nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	2300 København S
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50.000 Projektområdet er angivet med blå polygon 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af	Oversigt der viser projektområdet (blå linje).

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).



Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11. b: Anlæg til bortskaffelse af affald
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet er ejet af Københavns kommune.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Bebygget areal: 0 m ³ Fremtidigt befæstet areal: ca. 31.500 m ² Nye arealer som befæstes: ca. 29.000 m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i	Grundvandssænkning vil være kortvarigt og i meget begrænset omfang. Det vil være i forbindelse med udgravninger på 3x3 m til maksimalt -2,8 m u.t. Samlede grundareal: ca. 31.500 m ²		

forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Bebygget areal: 0 m ³ Projektets nye befæstede areal: 29.000 m ³ Projektets samlede bygningsmasse: 0 m ³ Projektets maksimale bygningshøjde: 0 m Der skal ikke foretages nedrivningsarbejder i forbindelse med etablering af projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til rensesanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstoffer i anlægsfasen er vand, stabilgrus, asfalt og drængrus. Råstofmængder svarende til at anlægge pladsen på 3,1 ha. Affald i anlægsfasen: Almindeligt byggeaffald der bortskaffes efter gældende regulativer for affald. Evt. overskudsjord håndteres efter retningslinjer og tilladelser fra kommunen. Spildevand i anlægsfasen pumpes til eksisterende system. Der er ingen direkte udløb til recipienter i anlægsfasen Anlægsperioden starter når tilladelsen foreligger, Q3 og Q4 2024.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Råstofforbrug i driftsfasen udgøres af brændstof til materiel. Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen. Der vil i driftsfasen komme færdigvarer i form af det materiale der er nedknust i det det er vurderet genanvendelsesegnet. Vandforbrug i driftsfasen er meget begrænset og knytter sig til vanding for at nedbringe støvgener og vask af materiel og lastbiler.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	På pladsen modtages udokumenteret jord – dog overvejende jord der ikke umiddelbart syner og lugter forurennet. Der kan derfor ved karteringen påvises forurennet jord svarende til farligt affald. Andet affald er jord og byggeaffald som brokker, beton og asfalt. Dette udgør 235.000 tons svarende til 30-35 biler om dagen, hvoraf 2/3 del er med jord og resten er byggeaffald. Den del af byggeaffaldet der ikke kan genanvendes vil blive afskaffet til relevant modtager i overensstemmelse med Københavns Kommunes gældende affaldsregulativ. Idet jorden stammer fra bygge- og anlægsprojekter, vil der i begrænset omfang kunne

Håndtering af regnvand:	forekomme andet affald som plastikrør, glas, skrald, jern etc. Der vil på pladsen blive opstillet 1-2 containere til dette, og affaldet vil blive afskaffet til relevant modtager i overensstemmelse med Københavns Kommunes gældende affaldsregulativ. Overfladevand fra pladsen/perkolat udledes til perkolatbassin på pladsen og pumpes herefter til eksisterende spildevandssystem. Bassinet er etableret med dykket udløb, der har samme funktion som olieudskiller. Vand fra dræn under pladsen ledes til samme pumpestation som perkolat og pumpes ligeledes til eksisterende spildevandssystem.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		K 206 og K 212
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Projektet vil kunne overholde alle relevante vilkår angivet i Standardvilkårsbekendtgørelsen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Vejledning nr. 5/1884 om ekstern støj fra virksomheder

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Københavns Kommune har udarbejdet 'Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune'. Heraf fremgår grænseværdier for støj forbundet med bygge- og anlægsarbejder. Disse er opsummeret via nedenstående tabel	
			Hverdag mandag til fredag kl. 07:00-18:00 samt lørdage 8:00-14:00	70 dB(A)
			Andre tidsrum: Hverdag mandag til fredag kl. 17:00-07:00 og hele lørdag og søndag	40 dB(A)
			Maksimalværdi om natten (kl. 22:00-07:00)	55 dB(A)
			Ydermere må støjende, støvende og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 og lørdag kl 07:00-14:00.	
			Støj fra anlægsarbejde vil være af mindre betydning, og de lokalt fastsatte grænseværdier kan overholdes.	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Grænseværdien for erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder er overholdt i virksomhedens eget skel.	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Luftforurening kan forekomme som diffuse emissioner af støv. Det afhjælpes med vanding.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Luftforurening kan forekomme som diffuse emissioner af støv. Det afhjælpes med vanding.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der kan forekomme diffuse emissioner af støv i forbindelse med af- og pålæsning på pladsen, håndtering af materialer samt ved nedknusning af asfalt og bygningsaffald. Væsentlige gener som følge af diffus støvemission kan modvirkes ved vanding eller overdækning af materialer.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	I anlægsperioden vil der ikke forekomme lugtgener I driftsfasen vil den modtagne jord stamme fra vej- og byggeprojekter og vil derfor medføre lugtgener. Evt. lugtgener forventes i meget begrænset omfang og videresendes hurtigst muligt.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer		X	Jævnfør 'Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune' må anlægsarbejder kun foregå i hverdage mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 18:00, og lørdage kl. 08:00-14:00. Anlægget etableres i dagtimerne. Etableringen kan i vinterperioden eventuelt fordrer belysning kortvarigt morgen og aftenperioder. Der ventes ingen umiddelbare nabogener.	

og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Anlægget er ligeledes kun i drift i dagtimerne og også her kan det fordrer belysning kortvarigt morgen og aftenperioder om vinteren. Der ventes ingen nabogener.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Den nordlige del af planen er omfattet af Københavns Kommunes lokalplan 238-1. Etablering af "karteringsanlæg" kræver dispensation fra lokalplanens §5, stk.2 d) der fastlægger at område IV kan anvendes til kontrolleret losseplads med deponering af ikke-spiseligt affald. Den sydlige del af plads 2 og plads 3 er ikke omfattet af lokalplanen. Der søges en landzonetilladelse for denne del af pladsen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Projektet ligger inden for en skovbeskyttelseslinje i Københavns Kommune. Skovbeskyttelseslinjen overlapper med flere af virksomhederne på Selinevej. Projektet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen overlapper ligeledes med flere af virksomhederne på Selinevej.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Pladsen skal tilsluttes en transformerstation beliggende små 300 meter mod nordøst. Dette vil medføre nedgravning af ledninger uden for pladsens areal i anlægsfasen. Københavns Kommune ejer alle arealer der berøres.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet er placeret inden for kystnærhedszonen. Lokalplanens bestemmelser udlægger dog området til kontrolleret losseplads med deponering af ikke-spiseligt affald.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektet ligger ca. 100 meter fra § 3 strandeng, øst og sydøst for projektet
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Grønbroget tudse er blevet observeret af Københavns Kommune i 2006 inde på projektområdet. Denne er ikke observeret ved gennemgang i 2024. Et notat omkring kumulativ påvirkning af grønbroget tudse på Selinevej er vedhæftet som bilag. Notatet konkluderer at pladserne ikke benyttes af grønbroget tudse.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektet ligger indenfor det fredede område Kalvebod Kile.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet ligger ud til Natura 2000-området 143 Vestamager og Havet syd for, som består af habitatområde H 127 og fuglebeskyttelsesområde nr. 111.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Pladsen er ikke i sig selv placeret inden for et område med registreret jordforurening men dele af matriklen (matrikel 917, Sundby Overdrev, København) er V2-kortlagt, da det er en tidligere oplagsplads 1996-2008.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Risikoområde Køge Bugt - København
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er flere lignende anlæg i området nordøst for pladsen. Det vurderes imidlertid ikke at omfanget og driften af nærværende anlæg kan medføre kumulativ effekt ift. støj og jordforurening.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Tæt asfaltbelægning der forebygger nedsivning af overfladevand Robust afvandingssystem der sikrer at overfladevand fra pladsen og perkolatvand kun føres til spildevandsrensning og ikke havner i Vejdirektoratets bassin mod sydøst og andre uønskede steder. Korrekt håndtering af affaldsfraktionerne

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 27/11/2024 Bygherre/anmelder: KMC / COWI

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
