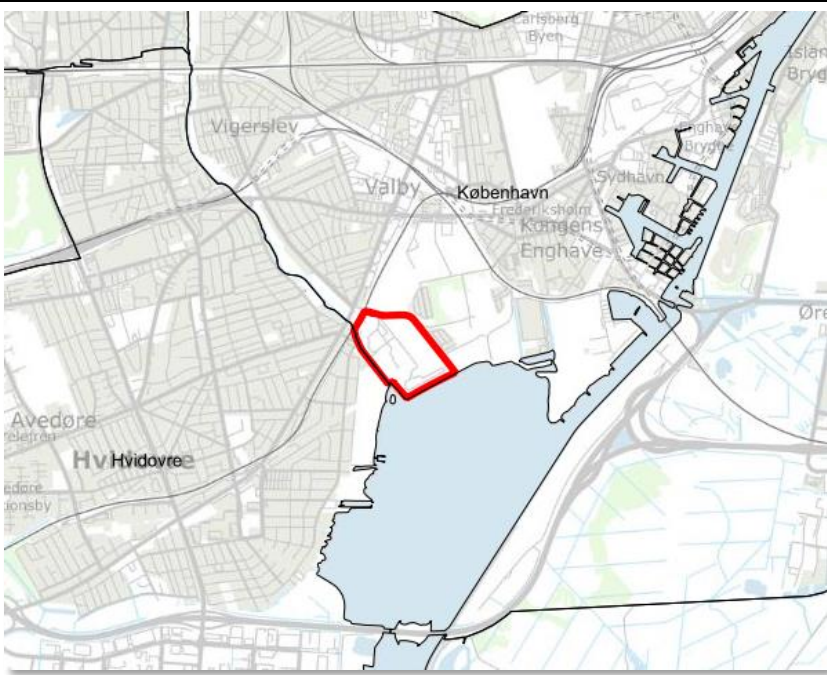


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af nyt nødstrømsanlæg på Renseanlæg Damhusåen som erstatning for det gamle. Formålet med etableringen af nødstrømsanlægget er at sikre, at der er strøm til opretholdelse af vitale processer på renseanlægget, i tilfælde af strømudfald. Nødstrømsanlægget med brændstoftank på op til 7.500 L er indbygget i en 40' container, som placeres i nærheden af ristebygværket. Den indfyrede effekt forventes at være mindre end 1 MW. Ved nødstrømsdrift, inkl. test drift i begrænsede perioder, vil elproduktionen udelukkende blive omsat til internt forbrug på Renseanlæg Damhusåen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BIOFOS A/S (Maria Gade Thomsen) Refshalevej 250, 1432 København K E-post: math@biofos.dk / Tlf.: (+45) 31 76 84 06
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Envidan A/S Nikolaj Feldbech Rasmussen E-post: nfr@envidan.dk / Tlf.: (+45) 46 47 31 89
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Renseanlæg Damhusåen Parkstien 12, 2450 København SV Matr. nr. 2650a, Vigerslev, København
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	(X)		Punkt 3a: a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika	Tekst
1 Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den	Matriklen ejes af: HOFOR Spildevand København A/S c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

	pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ca. 11.100 m ² .
	Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 96.800 m ² .
	Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ca. 80 m ² (betondække).
3	Projektets areal og volumenmæssige udformning	
	Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej
	Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 80 m ²
	Projektets bebyggede areal i m ²	Ca. 30 m ² .
	Projektets nye befæstede areal i m ²	Ca. 80 m ² (betondække).
	Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ca. 77 m ³ .
	Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ca. 3,6 m
	Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet omfatter ikke nedrivningsarbejder.
4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden.
	Vandmængde i anlægsperioden	Vand til støbning af betondække.
	Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Anlægsarbejdet forventes ikke at medføre produktion af affald.
	Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Anlægsarbejdet medfører ikke, at der afledes mere spildevand til renseanlæg.
	Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Anlægsarbejdet medfører ikke, at der afledes spildevand til vandløb, søer eller hav.
	Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ingen ændringer.
	Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	01/26-06/26

	Projektets karakteristika	Tekst
5	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Brændstoftanken er indbygget i containeren.
	Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Nødstrømsanlægget kører på diesel. Under kørsel er dieselforbruget er op til 200 L/t.
	Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen mellemprodukter og færdigvarer

	Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Elproduktion i driftsfase: <5 MW
6	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ingen. Kun luftemissioner under drift.
	Farligt affald:	Ikke relevant.
	Andet affald:	Ikke relevant.
	Spildevand til rensesanlæg:	Ikke relevant.
	Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ikke relevant.
	Håndtering af regnvand:	Regnvandet løber ud på græsset omkring betonpladen.

	Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra Virksomheder og Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift.
15	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Entreprenøren skal overholde vilkårene i støjvejledningen på 70 dB(A) for erhvervs- og industriområder, hertil skal Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift overholdes. Der forventes ingen nævneværdig støj i anlægsperioden udenfor almindelig arbejdstid. Afstande til nærmeste beboelse/areal er ca. 240 meter fra nødstrømsanlæggets placering.
16	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17	Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 4/1985 fra Miljøstyrelsen: Begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
18	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Der forventes ingen væsentlige yderligere punktkilder for lugt forbundet med projektet.
20	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	(X)		Der vil i forbindelse med etablering af nødstrømsanlæg ikke ske ændringer i lugtforhold på renseanlægget – eller øgede lugtgener - hverken i anlægs- eller driftsfasen
22	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
23	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

	Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Renseanlæg Damhusåen er omfattet af Lokalplan nr. 199 "Damhusåen" fra august 1992, hvis formål er at muliggøre udbygning af renseanlægget.
25	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej
26	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
29	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	

	Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
31	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 140 m til beskyttet vandløb vest for projektområdet.
32	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret forekomst af beskyttede arter på det berørte areal (Kilde: Arter.dk).
33	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 140 m til fredet område Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken
34	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 480 m til Natura 2000 område nr. 143 Vestamager og havet syd for.
35	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Området er V2-kortlagt, da der tidligere har været aktiviteter relateret til genbrug af metallaftaffaldsprodukter, Opsamling og behandling af spildevand samt indsamling af affald på arealerne. Der er fundet tungmetaller i jorden og grundvandet, samt blandt andet losseplads perkolat, BTEX og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet. Det ansøgte projekt medfører ikke, at der graves i forurennet jord.
38	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko-område for oversvømmelse?	X		Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området. Nødstrømsanlægget og brændstoftank er indbygget i en 40' container, der anlægges en betonplade i kote 2,5 m DVR90. Kote er valgt på baggrund af en stormflodsstatistik for Renseanlæg Damhusåen, der viser, at en placering i kote 2,5 m DVR90 sikrer mod en 250-års hændelse i 2050.
40	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 11. juli 2025

Bygherre/anmelder: Nikolaj F. Rasmussen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
