

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	BIOFOS A/S ønsker at renovere 4 af deres 7 forklaringstanke i Damhusåens Renseanlæg. Placeringerne fremgår af det vedhæftede kort. Arbejdet planlægges således, at der reparerer én tank ad gangen. Tankene skal være tømme for spildevand til at kunne renovere betonbunden. Det indebærer, at der gennemføres grundvandssænkning i 14 dage fra omkringliggende eksisterende drænbrønde, efterfulgt af en pause på 14 dage, hvorefter processen gentages for den næste tank. Dette forløb fortsætter, indtil de 4 tanke er gennemgået. Den forventede ydelse er estimeret til 50 m ³ /t, svarende til i alt 67.200 m ³ i pumpeperioden. Der forventes samme mængde afledt grundvandsvolumen til kloak via vandbehandlingsanlæg. Disse oppumpninger vurderes ikke at påvirke de omkringliggende naturområder og naboejendomme, da det er meget lokalt og sænkes blot i 3 m u. t. i fyld lag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BIOFOS A/S, Refshalevej 250, 1432 København K tlf.: +45 32 57 32 32, mail: post@biofos.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Alex Durhuus Kjærholt Produktionsleder Tlf.: +45 31361993, mail: alkj@biofos.dk Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 Valby
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 Valby Matr. Nr.: 2650a Ejer: HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt kort i 1:50.000 figur 1.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget	Vedlagt kort i 1:10.000 figur 2.

og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER / m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Matr. Nr.: 2650a Ejer: HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S Ørestads Boulevard 35, 2300 København S		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.			
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²	Ingen bebyggede areal, blot renovering af betonbunden af eksisterende forklaringstanke.		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Ikke relevant.		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Ikke relevant.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Ja, ca. 3 m u. t., dvs. 1,8 m fra rovandsspejl i fyld lag.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²	De 4 forklaringstanke ligger på et areal på ca. 4225 m².		
Projektets bebyggede areal i m²	Hele projektarealet er bebygget.		
Projektets nye befæstede areal i m²	Ikke relevant.		
Projektets samlede bygningsmasse i m³	Ingen bygningsmasse.		
	Ingen bygningshøjde.		

Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ca. 67.200 m³ oppumpede grundvand Ikke relevant Ca. 67.200 m³ afledte grundvand til spildevandskloak. Ikke relevant Ikke relevant 09/26 - 12/26
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	

Farligt affald:	Intet affald eller spildevand i driftsfasen af grundvandssænkning. Blot afledte grundvand til kloak.		
Andet affald:			
Spildevand til rens anlæg:			
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			
Håndtering af regnvand:	Ingen håndtering af regnvand som følge af grundvandssænkingsprojektet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ej relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ej relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Ej relevant.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Ej relevant.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ej relevant.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ej relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Hele Damhusåens Renseanlæg ligger i kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	

(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Beskyttede vandløb Harrestrup å 40 m sydvest for projektområdet. Der ses dog ingen påvirkning af vandstanden ved prøvepumpningen i DB1 ved forklaringstank nr. 7. Se vedhæftede graf over vandstandsmålinger med datalogger placeret i åen og oversigt over placeringen af drænbrøndene på figur 3. Beskyttet eng 327 m syd for projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Ifølge arter.dk er der fund af græsrandøje 357 m nordvest for projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			30 m sydvest for projektområdet er kysten af Harrestrup å fredet. 365 m nordøst for projektområdet er Valbyparken fredet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde (hav) 350 m sydøst for projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Grundvandssænkningen er så kortvarige og lokalt, at der vurderes ikke væsentlig påvirkning på grundvandet i fyld lag og Harrestrup å.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Ja, området er V2 kortlagt. Renseforanstaltninger er etableret inden afledning af grundvand til kloak.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektet er placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Tætte boringsafslutninger er etableret på eksisterende borer / brønde som bruges til grundvandssænkning, så der ikke kan løbe overfladevand ned i borerne.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Projektet er placeret i et område med risiko for oversvømmelse. Tætte boringsafslutninger er etableret på eksisterende borer / brønde som bruges til grundvandssænkning, så der ikke kan løbe overfladevand ned i borerne.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne		X	Det kendes ikke.

medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der vurderes ikke væsentlige skadelige virkninger for miljøet ved de udførende arbejder.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13-07-2026 Bygherre/anmelder: Rambøll på vegne af BIOFOS

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.




Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur 1: Kort over området i målestoksforhold 1:50.000.

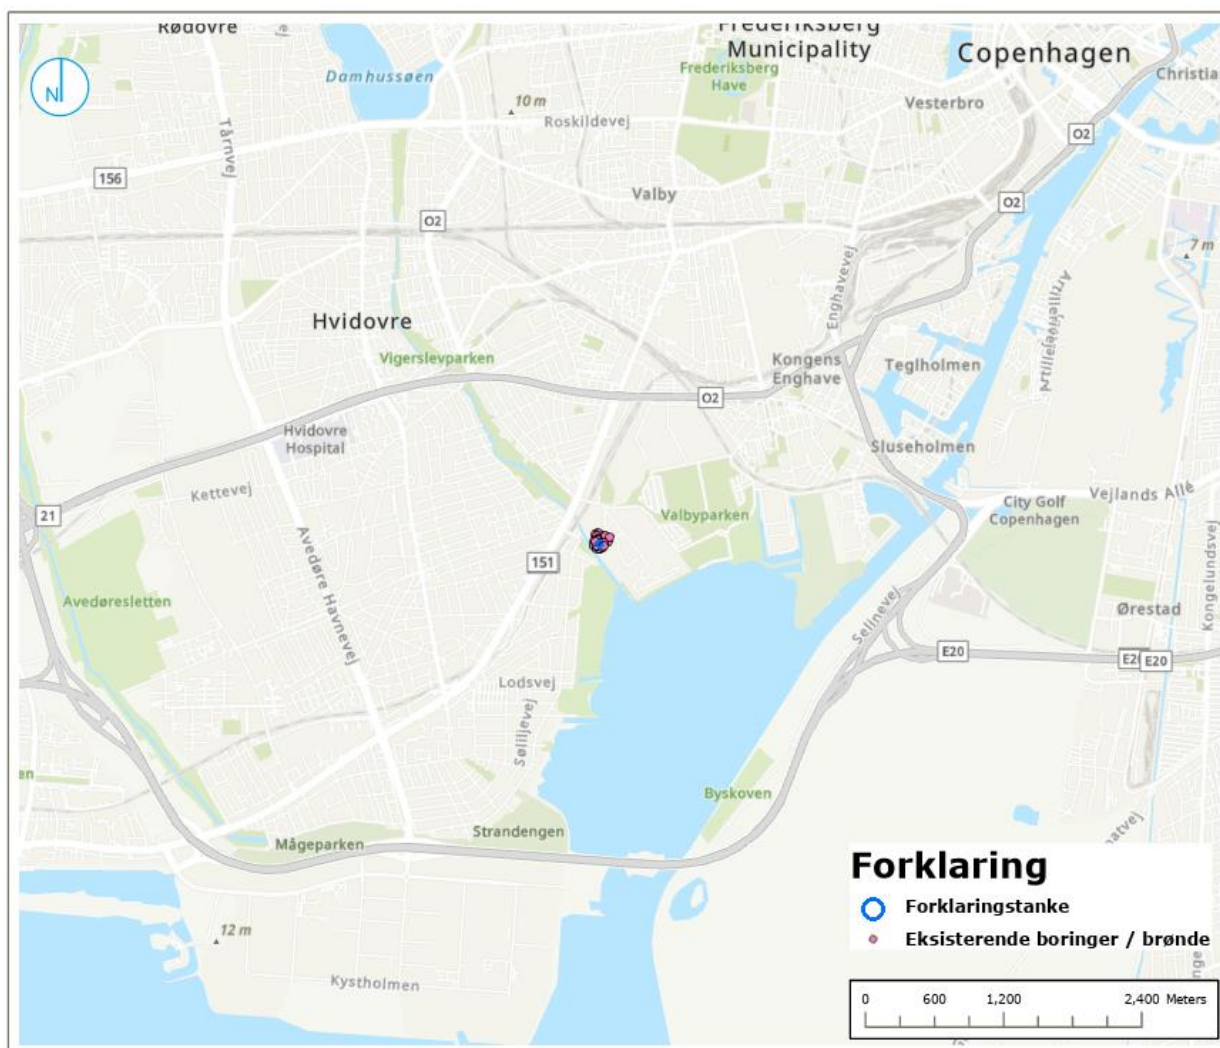

Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur 2: Kort over området i målestoksforhold 1:10.000.

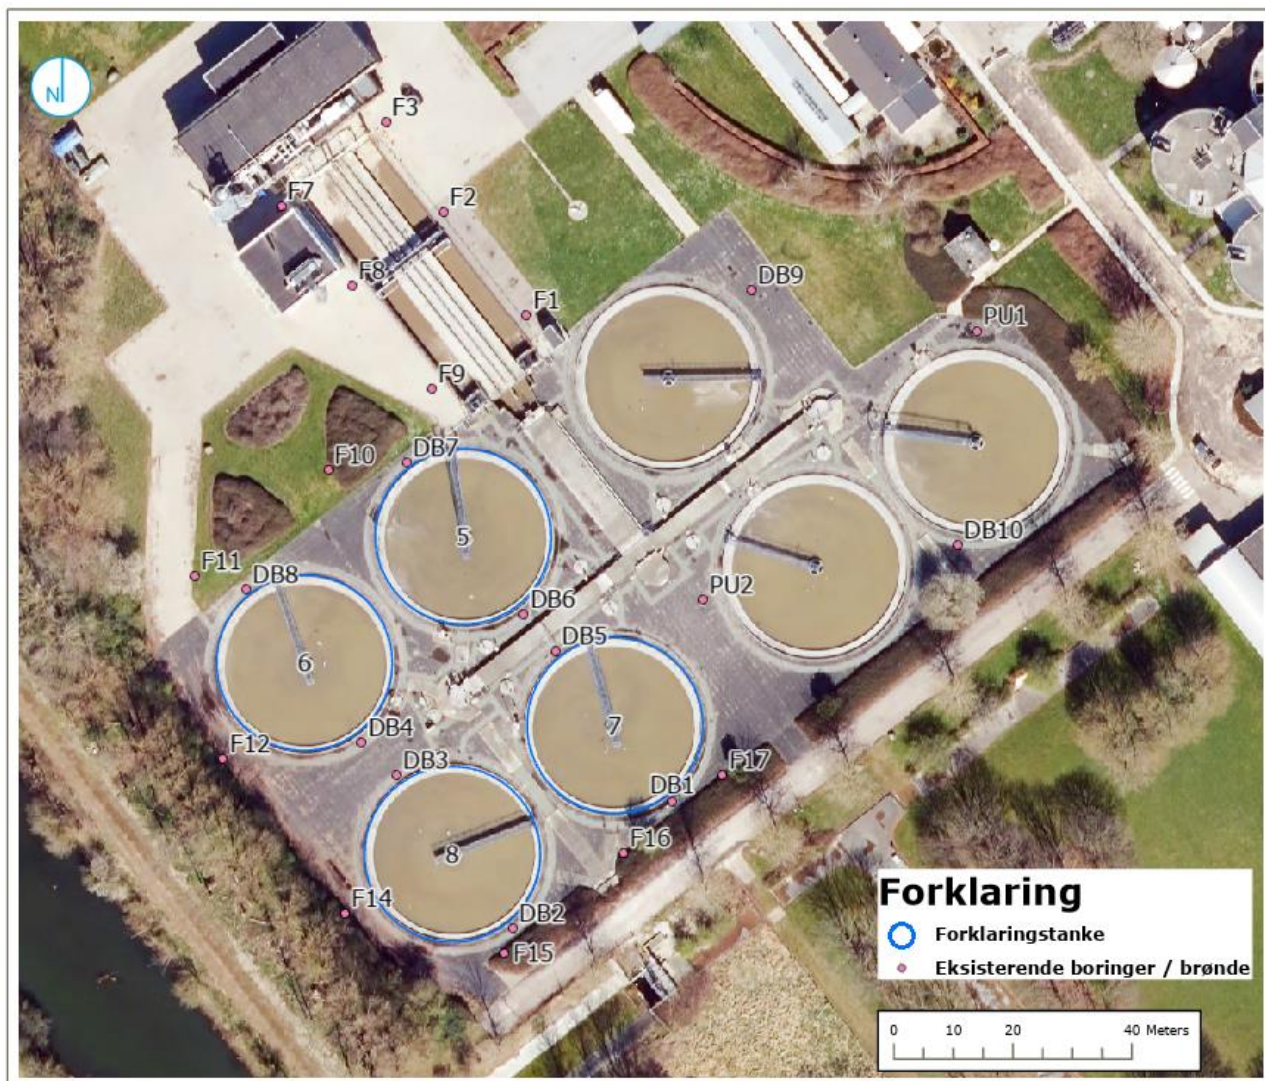



Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur 3: Kort over forklaringstanke og eksisterende boringer / brønde i målestoksforhold 1:1.000.

3/20/2026 12:00 AM - 3/21/2026 12:00 AM

Harrestrup Å (1/4-hour values)

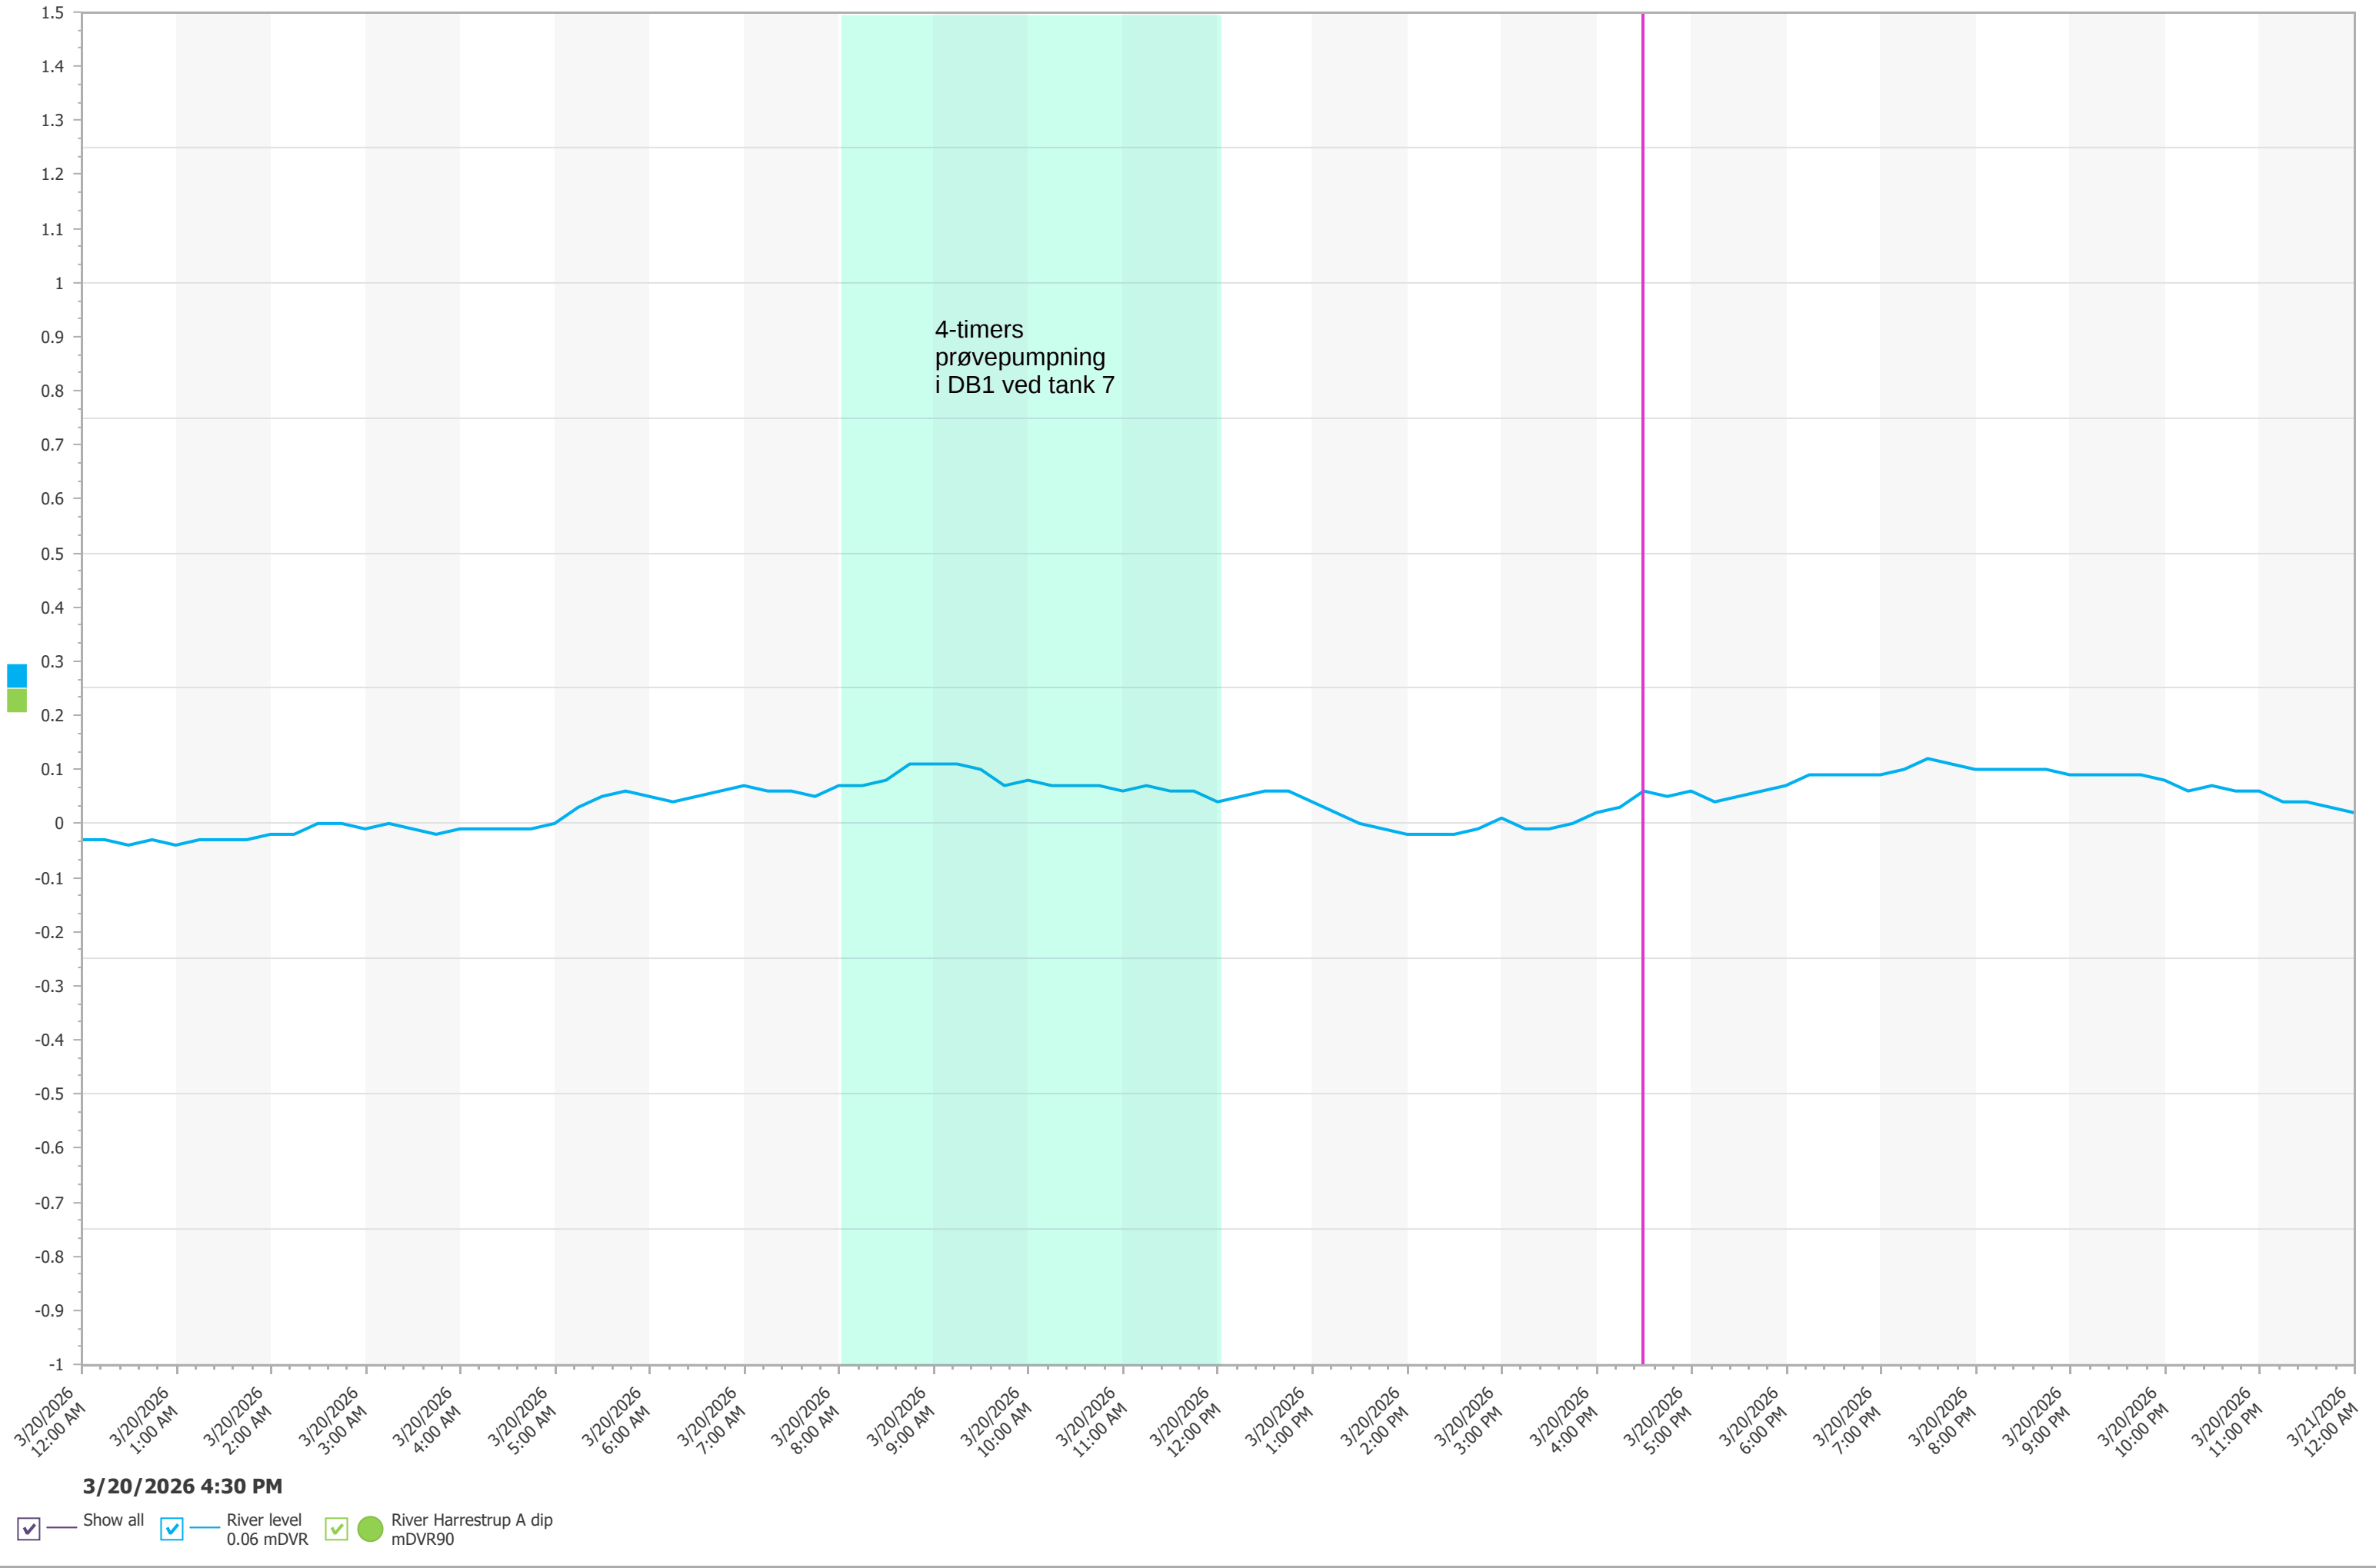

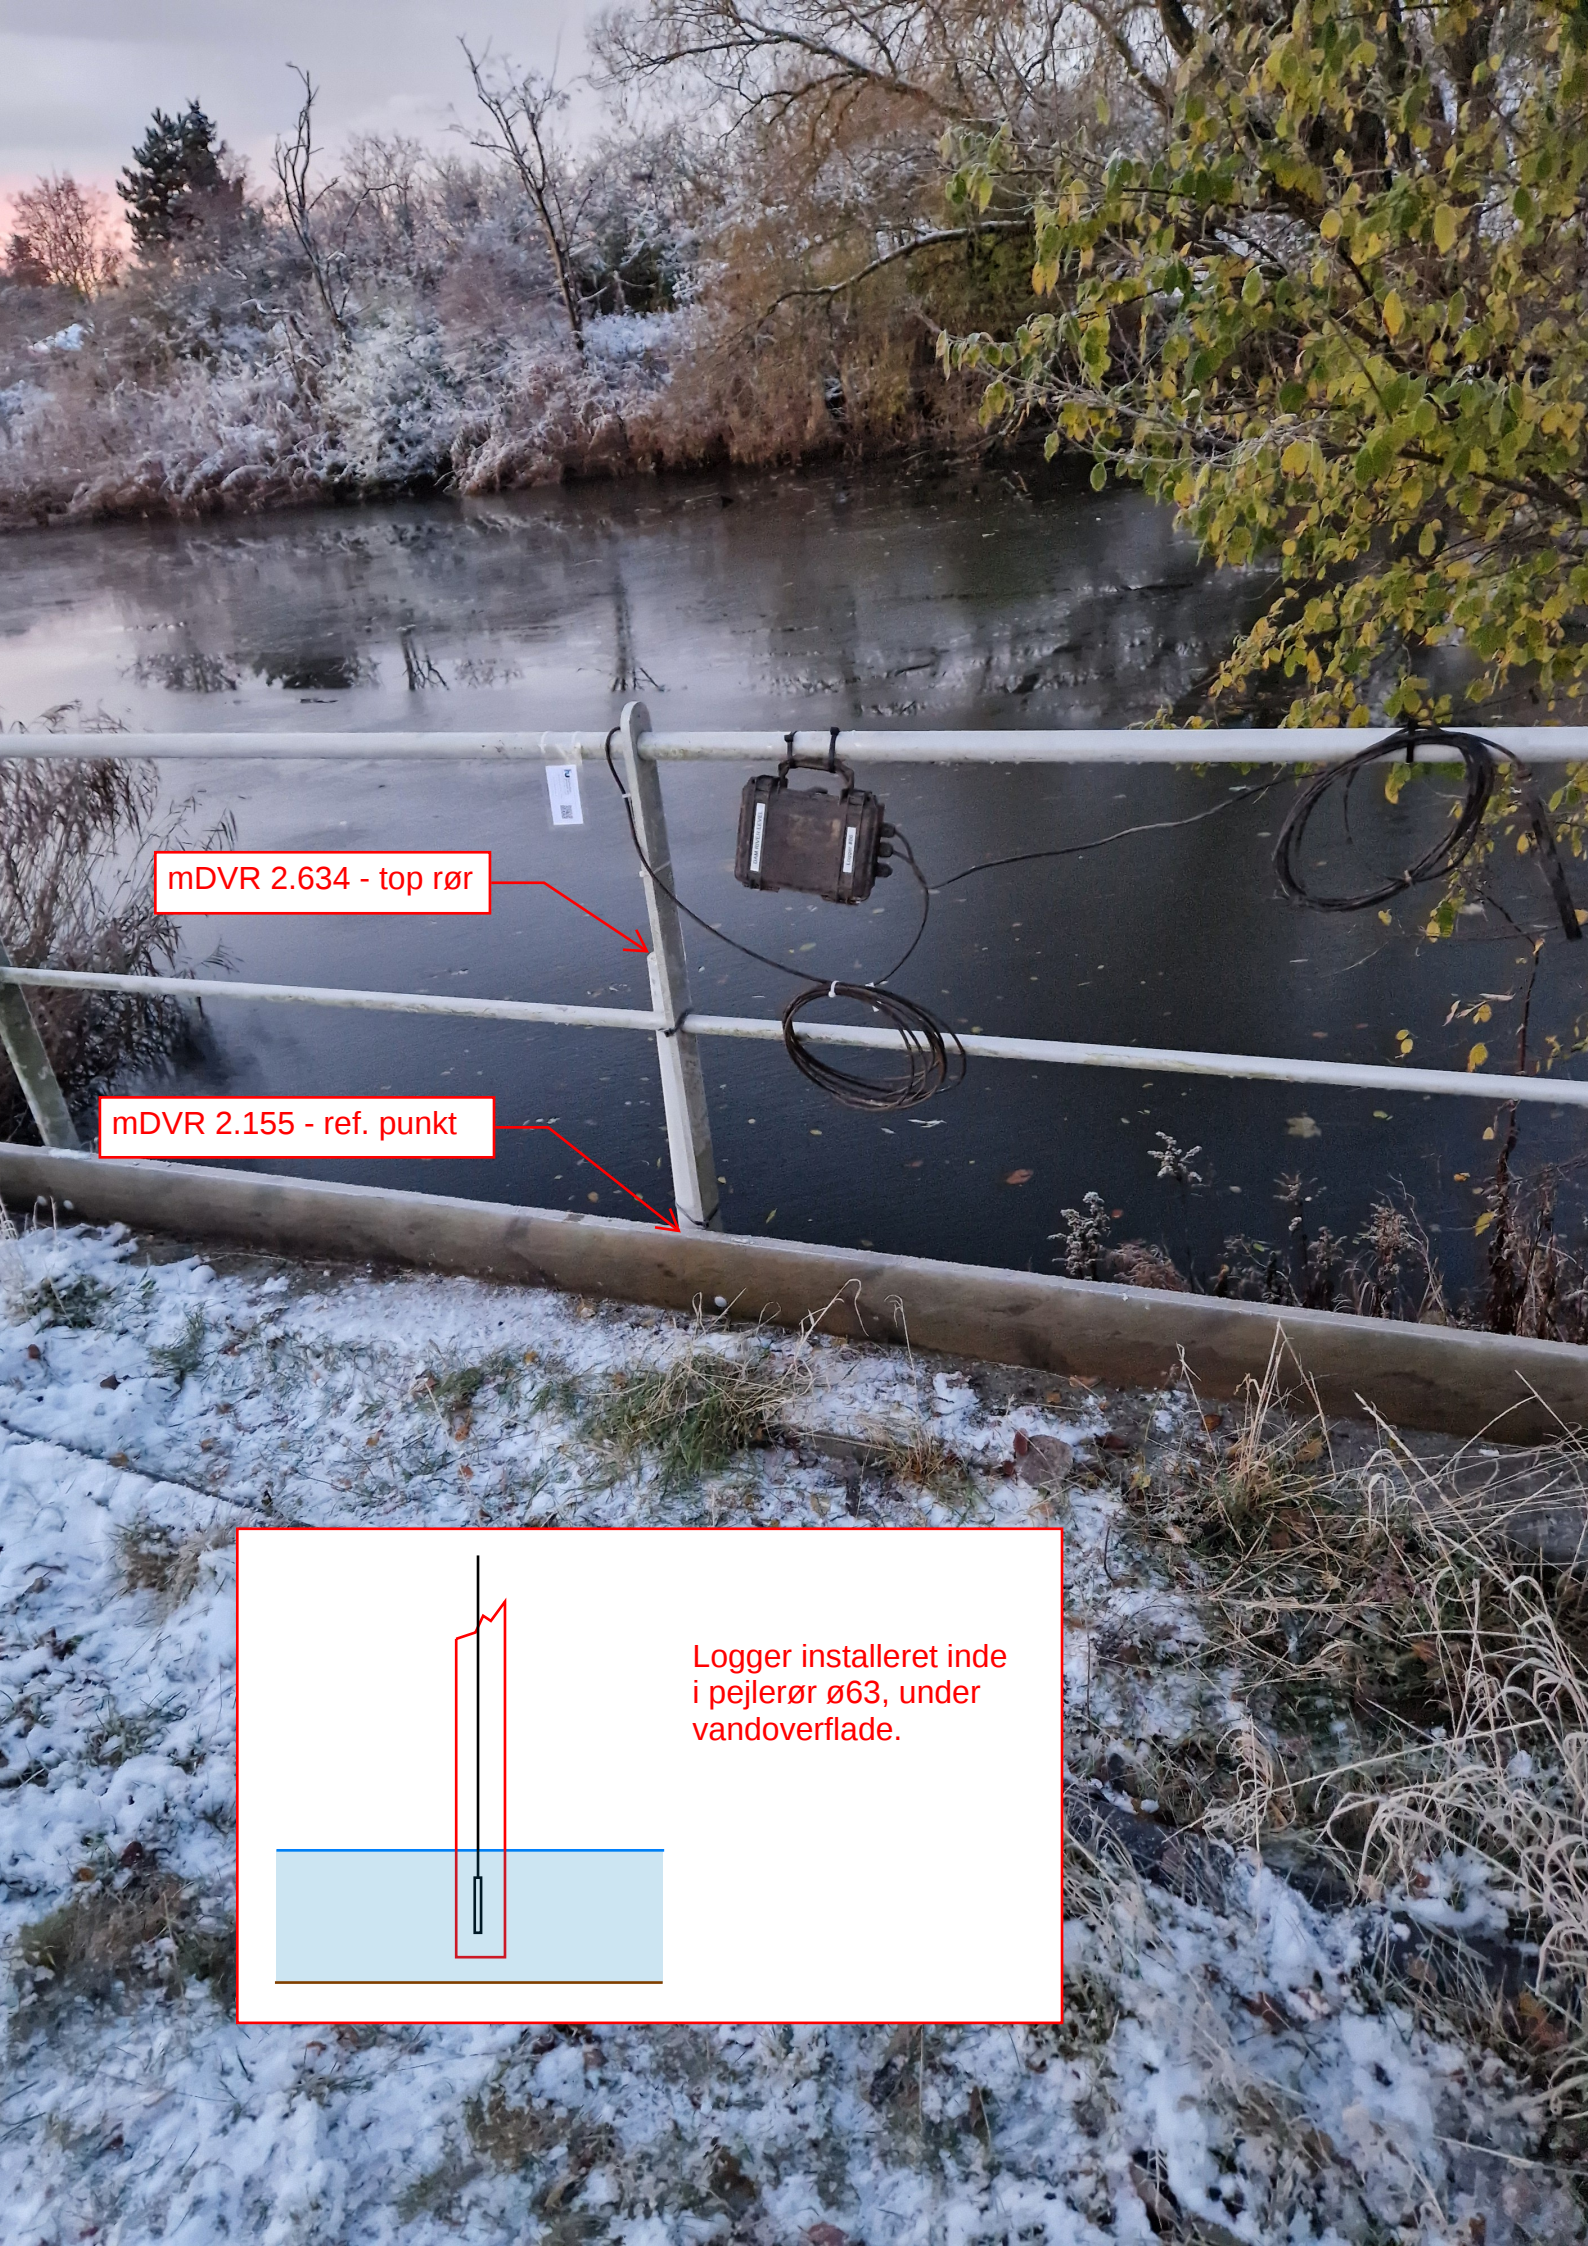

mDVR 2.634 - top rør

mDVR 2.155 - ref. punkt

