Ansøgningsskema – screening efter miljøvurderingsloven

Jfr. Bilag 1 til Miljøvurderingsbekendtgørelsen[1].

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21[2]. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, vedlægges disses oplysninger.

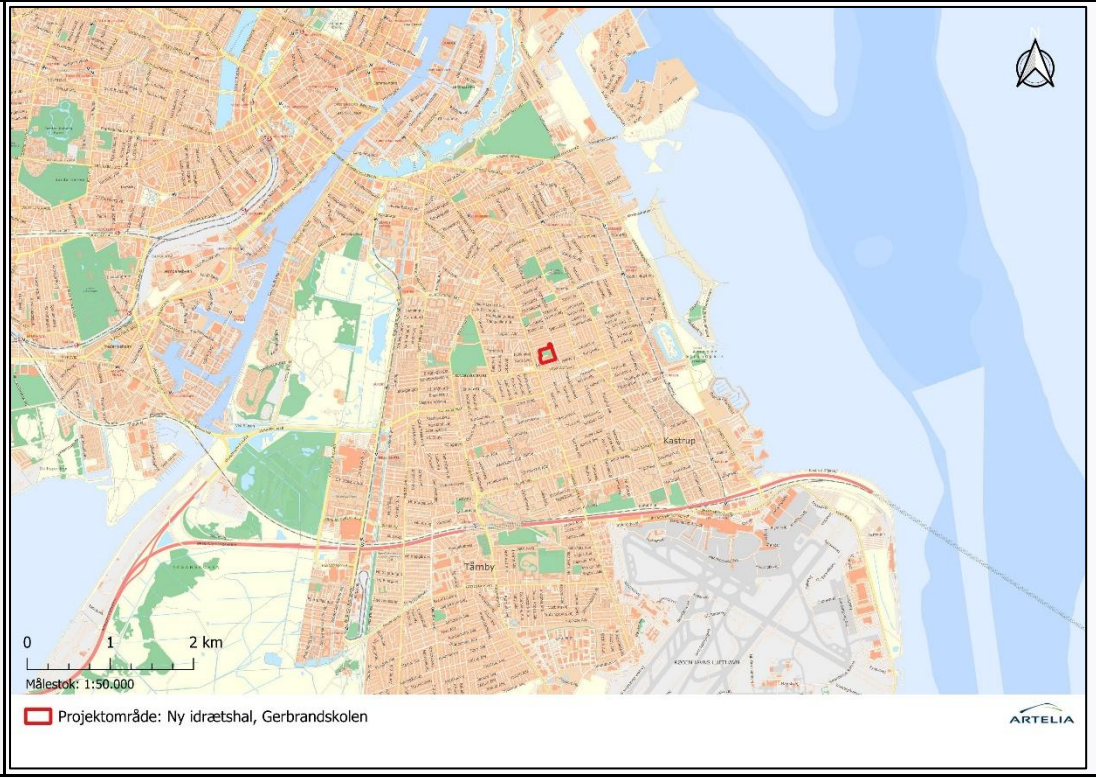
Projektnavn:	Ny idrætshal, Gerbrandskolen
Ansøger:	Københavns Kommune
Dato:	28.05.2026

Udarbejdet af: EMBB
Kontrolleret af: MOJE
Godkendt af: JERO
Dato: *28.05.2026*
Version: *1.0*
Projekt nr.: *1024585*

[1] Bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringsbekendtgørelser

[2] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering med senere ændringsbekendtgørelser

Basisoplysninger	
	Tekst
Projektets/sagens titel	Ny idrætshal, Gerbrandskolen
Projektbeskrivelse (supplerende beskrivelse kan vedlægges som bilag)	Projektet omfatter opførelse af en ny idrætshal og kunstgræsbane i tilknytning til Gerbrandskolen på Amager. Projektet etableres som en udvidelse af skolens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter og omfatter en idrætshal samt tilhørende udearealer, herunder etablering af kunstgræsbane. Projektet er placeret på eksisterende skolearealer i byzone og indgår som en integreret del af skolens samlede idrætsfaciliteter.
Oversigt over vedlagte bilag	**Bilag 1:** Levestedsvurdering af beskyttede arter **Bilag 2:** Trafiknotat **Bilag 3:** Undersøgelse af støj fra ny kunstgræsbane **Bilag 4:** Belysning – Gerbrandskolen boldbane
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på **bygherre**	Navn/virksomhed: Københavns Ejendomme, Københavns Kommune
	Adresse: Borups Allè 177, 2400 København NV
	Tlf: / 7080 8000
	E-mail: kejd@kk.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på **kontaktperson**	Navn: Jens Røschmann, Artelia A/S
	Adresse: Bellidavej 20, 2500 Valby
	Tlf: +45 2329 2572
	E-mail: jero@arteliagroup.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Adresse: Gerbrandsvej 9, 2300 København	
	Matr.nr.: 3875	
	Ejerlav: Sundbyøster, København	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (både den eller de kommuner, som projektet er placeret i og den eller de kommuner, hvis miljø kan blive påvirket af projektet)	Københavns Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Angiv målestok.		

Forholdet til miljøvurderingslovens bilag 1 og bilag 2				
	Ja	**Nej**	**Tekst**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk miljøvurdering.		X	Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete	X		Angiv punktet på bilag 2:	

projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:			10. Infrastrukturprojekter, litra b): Anlægsarbejder i byzone[3].	

Projektets karakteristika – areal, dimensioner m.v.	
	Tekst
1. Ejerforhold. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på ejer, samt matr.nr. og ejerlav	Ejer: Københavns Kommune, KEJD
	Adresse: Borups Allè 177, 2400 København NV
	Tlf: 3366 6100
	E-mail: kejd@kk.dk
	Matr.nr og ejerlav: 3875, Sundbyøster, København
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
- Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2	2.005 m^2
- Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2	Ca. 3000 m^2.
- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	2.005 m^2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet? Hvis ja, angiv sænkningen i meter	Der forventes ikke behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med anlægsfasen.

[3] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven), LBK nr. 4 af 03/01/2023

- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2	Ca 5.000 m^2.	
- Projektets bebyggede areal i m^2	2.005 m^2	
- Projektets nye befæstede areal i m^2	3.000 m^2	
- Projektets samlede bygningsmasse i m^3	13.000 m^3	
- Projektets maksimale bygningshøjde i meter over terræn	11 meter	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke nedrives bygninger eller lignende.	

Beskrivelse af anlægsperioden	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Estimerede mængder
- Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde.	Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et detailprojekteret grundlag for opgørelse af råstofforbrug i anlægsfasen. Endelige typer og mængder af materialer fastlægges i forbindelse med projektering og entreprenørens planlægning af udførelsen. Anlægsarbejdet forventes gennemført efter almindelig praksis med fokus på ressourceoptimering og begrænsning af materialeforbrug.
- Vandmængde i anlægsperioden	Der forventes alene et begrænset og midlertidigt vandforbrug relateret til almindelige anlægsaktiviteter. Endelig opgørelse af vandforbrug foreligger ikke på nuværende tidspunkt og afhænger af entreprenørens metodevalg og den endelige tidsplan.
- Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Affaldsmængder og affaldsfraktioner er ikke endeligt fastlagt på screeningstidspunktet. Eventuelt affald i anlægsfasen forventes primært at bestå af almindelige bygge- og anlægsrelaterede fraktioner

	og vil blive håndteret og bortskaffet i overensstemmelse med gældende affaldsregler og kommunale anvisninger.	
- Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – angiv mængde og periode	Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at opgøre eventuelle spildevandsmængder fra anlægsfasen. Eventuelt spildevand forventes primært at være relateret til almindelige velfærdsfaciliteter og håndteres efter gældende regler. Omfang og periode fastlægges i forbindelse med den endelige planlægning af anlægsarbejdet.	
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - angiv mængde og periode	Ingen	
- Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Eventuelt tilløbende overfladevand, herunder regnvand, håndteres ved afledning til det offentlige regnvandssystem.	
- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Fra maj 2028 – til november 2029	
Beskrivelse af driftsfasen		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		
- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der anvendes ikke råstoffer i driftsfasen i betydningen produktionsrelaterede råstoffer. Projektet omfatter en idrætshal og en kunstgræsbane, hvor driften ikke indebærer industrielle processer eller råstofbaseret produktion. Der kan forekomme almindeligt forbrug af materialer i forbindelse med vedligeholdelse af faciliteter og udearealer, men ikke i et omfang, der kan karakteriseres som råstofforbrug i miljøvurderingsmæssig forstand.	
- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Der forekommer ikke mellemprodukter i driftsfasen, da projektet omfatter idrætsfaciliteter (idrætshal og kunstgræsbane) uden produktions- eller forarbejdningsprocesser. Driften består alene af brug, service og almindelig vedligeholdelse af anlægget.	

- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Der forekommer ikke færdigvarer i traditionel forstand, da projektet ikke omfatter produktion, detailhandel eller lagerfunktioner. Driften af idrætsanlægget består af brug af faciliteterne til sport og fritidsaktiviteter samt almindelig drift og vedligeholdelse af bygning og udearealer.	
- Vandmængde i driftsfasen (m^3/år)	Vandforbruget i driftsfasen vil primært bestå af almindeligt forbrug i forbindelse med idrætsanlæggets drift, herunder omklædningsfaciliteter, toiletter, rengøring samt eventuelle drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter. Forbruget forventes at svare til tilsvarende kommunale idrætsfaciliteter af samme størrelse og anvendelse og vil være tilsluttet det offentlige vandforsyningssystem.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		
- Farligt affald:	Der forventes ikke at opstå farligt affald i væsentlige mængder i driftsfasen. Mindre mængder kan forekomme i forbindelse med drift og vedligehold af idrætsanlægget, herunder udtjente lyskilder, batterier, elektronik samt eventuelle kemikalier i begrænset omfang i forbindelse med rengøring og drift af faciliteter. Affaldet håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregler og via Københavns Kommunes affaldsordninger.	
- Andet affald:	Der vil i driftsfasen primært opstå almindeligt affald fra idrætsfaciliteterne, herunder restaffald, papir, plast og eventuelt emballageaffald i forbindelse med brug af omklædningsfaciliteter og arrangementer. Affaldet håndteres via de kommunale affaldsordninger og i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativ.	
- Spildevand til renseanlæg:	Spildevand fra projektet vil primært bestå af sanitært spildevand fra idrætshallens faciliteter (omklædning, toiletter m.v.) og vil blive afledt til det offentlige kloaksystem og videre til renseanlæg i overensstemmelse med Københavns Kommunes gældende spildevandsplan og gældende regler for afledning af spildevand.	
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der vil ikke ske direkte udledning af spildevand til vandløb, sø eller hav.	
- Håndtering af regnvand:	Regnvand håndteres i overensstemmelse med projektets regnvandsløsning og gældende krav i Københavns Kommune spildevandsplan.	

Projektets karakteristika - miljøprofil	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Vandforsyning til idrætshallen sker via det eksisterende offentlige forsyningsnet. Der etableres nyt vandstik fra hovedledning i Gerbrandsvej samt ny intern vandinstallation i forbindelse med projektet. Forsyningen etableres efter HOFORs forskrifter. Der etableres ikke privat boring eller anden selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2079		X	Projektet omfatter etablering af ny idrætshal ved Gerbrandskolen samt tilhørende tekniske installationer i byzone. Projektet vurderes ikke at være en virksomhed eller aktivitet omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed eller øvrige relevante branchebekendtgørelser. Der er således ikke krav om standardvilkår eller branchebekendtgørelse i forbindelse med projektet.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter[4]? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen		X	Projektet omfatter etablering af ny idrætshal ved Gerbrandskolen samt tilhørende tekniske installationer i byzone. Projektet er ikke en industriel virksomhed og er ikke omfattet af EU's BREF-dokumenter (BAT Reference Documents) under Industrial Emissions Directive (IED). BREF-dokumenter vedrører typisk industrielle anlæg og produktionsprocesser med væsentlige emissionsforhold omfattet af IE-direktivets listepunkter. Projektet indebærer ikke anlæg eller aktiviteter, som er omfattet af gældende BREF-dokumenter på Miljøstyrelsens liste[5].

[4] BREF-dokument = BAT-referencedokument. Gælder for udvalgte, store virksomheder omfattet af EU's IE-direktiv (Direktiv om industrielle emissioner).

[5] Miljøstyrelsen, Liste over BREF-dokumenter (BAT Reference Documents) under Industrial Emissions Directive (IED), senest opdateret 2006, tilgængelig på: https://mst.dk/luft-stoej/bref-bat-dokumenter

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen				
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner[6]? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. BAT/BREF - Miljøstyrelsen			Projektet omfatter etablering af en idrætshal med tilhørende faciliteter i byzone og udgør ikke en industri- eller produktionsvirksomhed omfattet af BAT-konklusioner. BAT-konklusioner (Best Available Techniques) er en del af EU's IED-rammeværk for industrielle anlæg med potentielt væsentlig forurening, og gælder typisk processer med emissionskrav til luft, vand og jord. Projektet vil ikke etablere eller drive aktiviteter, som er omfattet af gældende BAT-konklusioner på Miljøstyrelsens liste[7].	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.				
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/stoejgraenser	X		Projektet ligger i byzone og vil derfor være omfattet af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt eventuelle kommunale forskrifter for bygge- og anlægsarbejde. Anlægsarbejder vil blive udført inden for almindelig arbejdstid, og projektet forventes ikke at medføre væsentlige støjpåvirkninger for omkringliggende områder[89].	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og	X		Anlægsarbejdet forventes at kunne overholde de lokalt fastsatte støj- og vibrationskrav i Københavns Kommune, idet bygge- og anlægsarbejdet planlægges	

[6] BAT= Best Available Techniques. BAT-konklusioner er den del af et BREF-dokument, der beskriver, hvad der er BAT.

[7] Miljøstyrelsen, Liste over BREF-dokumenter (BAT Reference Documents) under Industrial Emissions Directive (IED), senest opdateret 2006, tilgængelig på: https://mst.dk/luft-stoej/bref-bat-dokumenter

[8] Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, vejledende støjgrænser og vurderingsprincipper for aktiviteter og anlæg, tilgængelig på: https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/stoejgraenser

[9] Miljøstyrelsen (2007). Støj fra veje. Vejledning nr. 4/2007.

vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen			og udføres i overensstemmelse med Københavns Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder (2024). Ifølge forskriften må støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde udføres mandag–fredag kl. 07.00–18.00 samt lørdag kl. 08.00–14.00. Særligt støjende aktiviteter, herunder eksempelvis betonophugning og betonskæring, må alene udføres på hverdage i tidsrummet kl. 08.00–17.00. Overholdelse af disse arbejdstidsbestemmelser forudsættes i projektets planlægning og udførelse, hvormed anlægsarbejdet vurderes at kunne gennemføres inden for gældende støj- og vibrationskrav[10].	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	X		Det samlede projekt, omfattende idrætshal og kunstgræsbane ved Gerbrandskolen, forventes at kunne gennemføres uden væsentlige støj- og vibrationspåvirkninger i forhold til omgivelserne. For idrætsaktiviteter på kunstgræsbane foreligger der ikke specifikke vejledende grænseværdier for støj fra organiseret idræt i Miljøstyrelsens vejledningssystem. Vurdering af støj fra idrætsanlæg foretages derfor som en konkret, planlægningsmæssig vurdering af tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune. Der er gennemført støjberegninger for anvendelsen af kunstgræsbane baseret på erfaringsdata fra sammenlignelige anlæg, herunder Kløvermarksundersøgelsen. Beregningerne viser et beregnet støjniveau ved nærmeste boliger på ca. 53–54 dB(A), hvilket er under den anvendte vejledende referenceværdi på 55 dB(A) for sammenlignelige boldbanefaciliteter. For idrætshallen vurderes støjbidraget primært at være relateret til normal anvendelse i byzone, herunder skole- og foreningsaktiviteter, uden karakter af industriel støjproduktion. På denne baggrund vurderes det samlede projekt at kunne gennemføres inden for de anvendte vejledende vurderingsniveauer for støj fra tilsvarende idrætsanlæg, og at vibrationspåvirkninger i driftsfasen er uden væsentlig miljømæssig betydning.	

[10] Københavns Kommune, Bygge- og anlægsforskrift i København, Forskrift februar 2024

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/		X	Projektet omfatter etablering af en idrætshal og kunstgræsbane i tilknytning til Gerbrandskolen i Københavns Kommune og omfatter ikke aktiviteter, der er omfattet af Miljøstyrelsens regler eller bekendtgørelser om luftforurening for virksomheder. De relevante regler for luftforurening, herunder Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen), finder primært anvendelse på virksomhedstyper med egentlige emissionskilder til luft, som er omfattet af miljøgodkendelsespligt eller tilsvarende regulering. Projektet vurderes ikke at omfatte sådanne emissionsgivende aktiviteter, hvorfor specifikke vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening ikke er direkte relevante for projektet.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	X			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	X		Det samlede projekt, omfattende idrætshal og kunstgræsbane ved Gerbrandskolen, vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening. I anlægsfasen kan der forekomme midlertidige og lokale emissioner i form af støv og udstødningsgasser fra entreprenørmaskiner og transport. Disse påvirkninger vurderes at være begrænsede, kortvarige og lokaliserede til byggepladsområdet og dets umiddelbare omgivelser. I driftsfasen forventes projektet ikke at give anledning til luftforurening af betydning, idet anvendelsen omfatter idrætsfaciliteter uden emissionsgivende produktionsprocesser. Samlet vurderes projektet derfor at kunne overholde gældende vejledende grænseværdier for luftforurening.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?				
- I anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		X	I anlægsfasen kan det i tørre perioder støve i forbindelse med jordarbejder, terrænregulering, etablering af befæstede arealer samt anlæg af kunstgræsbane og idrætshal. Støvudvikling vil primært være knyttet til tørre perioder og aktiviteter som jordhåndtering, kørsel med entreprenørmaskiner og materialetransport. Påvirkningen vurderes at være lokal og begrænset til byggepladsområdet samt	

			nærtliggende veje og omkringliggende arealer. Det indgår i bygherres instruks til entreprenør at foretage forbyggende vanding i perioder med væsentlig støvudvikling. Støvudviklingen vil være midlertidig og ophøre ved afslutning af anlægsarbejdet. Samlet vurderes anlægsfasen ikke at medføre væsentlige støvgener for omgivelserne.	
- I driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		X	I driftsfasen vurderes projektet ikke at give anledning til væsentlige støvgener. Idrætshallen vil være en lukket bygning, og kunstgræsbanen forventes ikke at medføre væsentlig støvdannelse under normal anvendelse og vedligehold. Eventuel lokal støvophvirvling i tørre perioder vurderes at være begrænset og uden væsentlig påvirkning af omgivelserne. Samlet vurderes driftsfasen ikke at medføre støvgener for naboområder.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Lugtgrænseværdier – Miljøstyrelsen Luftvejledningen				
- I anlægsperioden?		X	I anlægsfasen kan der forekomme kortvarige og lokale lugtgener i forbindelse med entreprenørmaskiner, jordarbejder og transport. Eventuelle lugtpåvirkninger vurderes at være begrænsede, midlertidige og primært lokaliseret til selve byggepladsområdet samt umiddelbare omgivelser.	
- I driftsfasen?		X	I driftsfasen vurderes projektet ikke at give anledning til væsentlige lugtgener. Idrætshallen er en lukket bygning, og kunstgræsbane samt tilhørende udearealer forventes ikke at medføre lugtpåvirkninger af betydning for omgivelserne. Samlet vurderes projektets driftsfase ikke at medføre lugtgener for naboområder.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.				

- I anlægsperioden?		X	Anlægsarbejdet vil i begrænset omfang kunne medføre behov for arbejdsbelysning i mørke perioder. Arbejdet vil dog i overensstemmelse med Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift foregå mandag-fredag fra kl. 7.00 til 18.00 og lørdag fra kl. 8.00 til 14.00[11]. Af den årsag vil behovet for arbejdsbelysning være kortvarig, midlertidig, rettet mod områder med byggeaktivitet og afgrænset til selve byggepladsområdet.	
- I driftsfasen?	X		Projektet omfatter etablering af belysning til idrætshal, kunstgræsbane samt tilhørende adgangs- og opholdsarealer. Den udendørs belysning omfatter primært sportsbelysning til kunstgræsbanen samt orienterings- og tryghedsbelysning omkring adgangsarealer. Udformningen af belysningsanlægget er dokumenteret i særskilt teknisk lysnotat og er projekteret med henblik på at begrænse lysudbredelse og gener for omkringliggende boliger mest muligt. Kunstgræsbanens sportsbelysning dimensioneres til et maksimalt belysningsniveau på 125 lux på selve spillefladen, hvilket opnås ved anvendelse af asymmetriske LED-projektører monteret på 9 m høje master. Der etableres 3 stk. 1-moduls projektører med kipning på 5° på den ene side af banen og 3 stk. 2-moduls projektører med kipning på 15° på den modsatte side, hvor afstanden til banen er størst. Projektørernes asymmetriske lysfordeling og begrænsede kipvinkler er valgt for at koncentrere lysudsendelsen mod spillearealet og reducere opadrettet og horisontal lysudbredelse uden for anlægget. De gennemførte lysberegninger viser, at spildlyset ved nærmeste private opholdsarealer er begrænset. Ved maksimal drift (125 lux på banen) beregnes lysniveauet til ca. 0,18 lux ved nærmeste bygning og op til ca. 1,88 lux umiddelbart bag hæk mod naboarealer. Til sammenligning giver en fuldmåne typisk ca. 0,2 lux. De beregnede niveauer vurderes derfor at være meget begrænsede og uden væsentlig påvirkning af omgivelsernes anvendelse eller oplevede mørkekvalitet.	

[11] Bygge- og anlægsforskrift i København -2024.

			Belysningsanlægget etableres desuden med mulighed for driftsmæssig dæmpning, således at højeste lysniveau alene anvendes ved kampe eller særlige aktiviteter, mens daglig brug kan ske ved reduceret belysningsstyrke. Der henvises til teknisk fagnotat om belysning for nærmere dokumentation af lysberegninger og projekteringsforudsætninger.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen[12]? Risikobekendtgørelsen		X	Projektet omfatter etablering af idrætshal og kunstgræsbane i tilknytning til Gerbrandskolen i Københavns Kommune og er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Risikobekendtgørelsen omfatter virksomheder og anlæg, hvor der håndteres, opbevares eller anvendes større mængder farlige stoffer, som kan medføre en væsentlig risiko for større uheld med konsekvenser uden for virksomhedens område. Projektet indebærer ikke anvendelse eller opbevaring af farlige stoffer i sådanne mængder eller karakter, og vurderes derfor ikke at være omfattet af reglerne.	

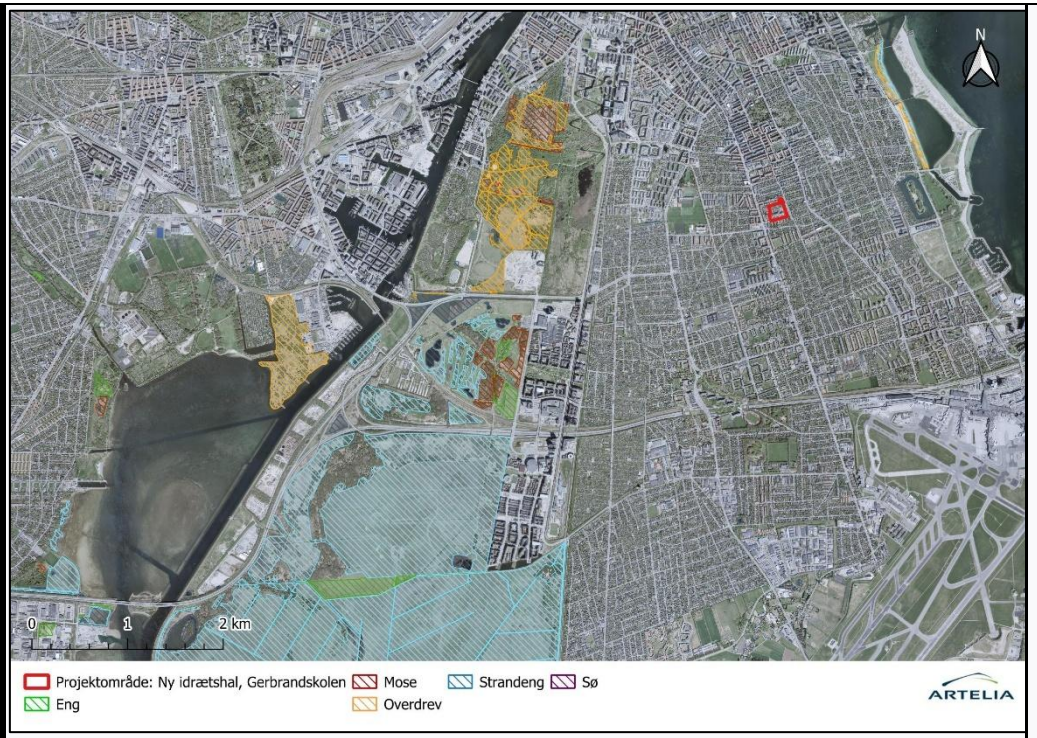
Projektets placering – interaktion med omgivelserne			
	Ja	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor. Find lokalplan	X		Projektområdet ved Gerbrandskolen er ikke omfattet af gældende lokalplan eller byplan. Det fremgår af det tilhørende byggeprogram, at Københavns Kommune har vurderet, at etablering af idrætshal og kunstgræsbane i området ikke udløser krav om udarbejdelse af ny lokalplan. Projektet gennemføres således inden for de gældende planmæssige rammer i Københavns Kommune og vurderes at kunne realiseres uden lokalplanlægning.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja«, angiv hvilke.		X	Projektet ligger uden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer og forudsætter derfor ingen dispensation[13].

[12] Miljø- og Ligestillingsministeriet, Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen), med senere ændringer
[13] Miljøministeriet, Arealinformation – Bygge- og beskyttelseslinjer, tilgængelig via Danmarks Miljøportal

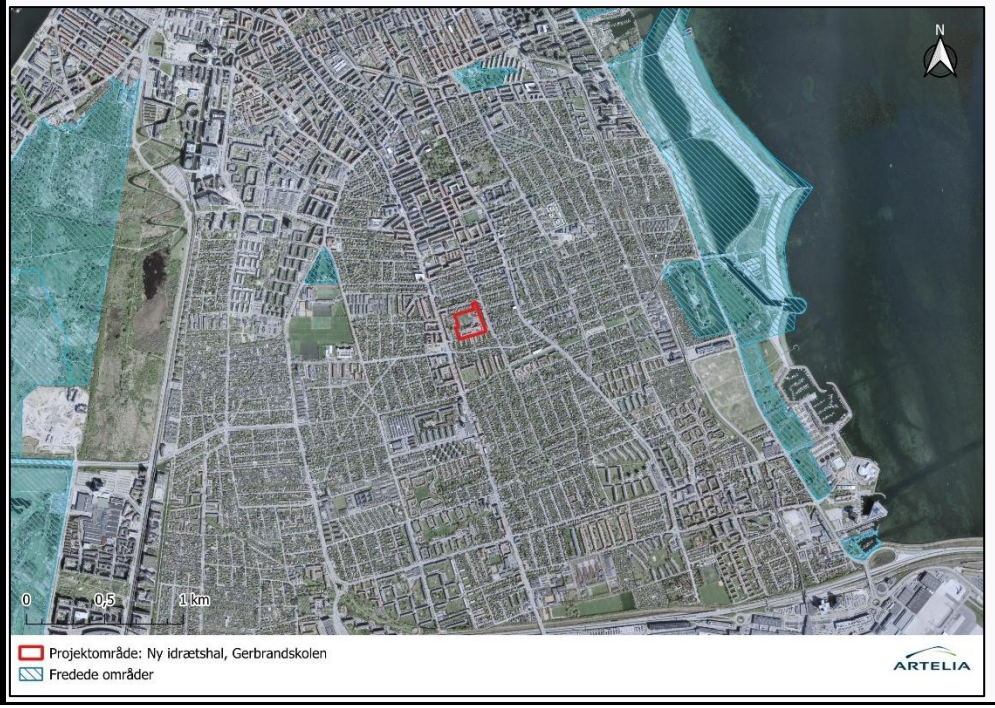
Find bygge- og beskyttelseslinjer				
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet ved Gerbrandskolen omfatter etablering af idrætshal og kunstgræsbane inden for skolens eksisterende matrikel og indebærer ikke behov for permanent eller midlertidig begrænsning af anvendelsen af omkringliggende naboarealer. Naboområderne består blandt andet af daginstitutioner, et villakvarter mod nord ved Amsterdamvej samt tekniske anlæg mod vest. Projektet medfører ikke ekspropriation, fysisk indgreb eller afspærring af naboejendomme. Adgang til området samt transport af materialer vil ske via eksisterende offentlige veje uden begrænsning af naboernes anvendelse af egne arealer. Projektets bygningsvolumen er udformet med henblik på at minimere visuelle og skyggerelaterede påvirkninger af naboområder. Hallens udformning med terrasseret bygningskrop og saddeltag reducerer skyggepåvirkning mod de omkringliggende boligområder, herunder villakvarteret mod nord, således at nabomatrikler i videst muligt omfang friholdes for væsentlige skyggegener. Endvidere er der foretaget en særskilt vurdering af lysforhold fra den planlagte sportsbelysning til kunstgræsbanen. På baggrund af lysberegninger dokumenteret i teknisk fagnotat er belysningsanlægget projekteret med henblik på at begrænse lysudbredelse og spildlys mod omkringliggende arealer, herunder nabobebyggelse. Belysningsløsningen omfatter asymmetriske projektører og begrænsede kipvinkler, som koncentrerer lyset mod spillefladen og reducerer udstråling uden for anlægget. De udførte lysberegninger viser, at spildlyset ved nærmeste private haver ved maksimal drift (125 lux på boldbanen) er beregnet til op til ca. 1,88 lux umiddelbart bag hæk og ca. 0,18 lux nærmest bygning. Belysningen kan samtidig dæmpes, således at højeste lysniveau alene anvendes ved kampe eller særlige aktiviteter. Samlet vurderes projektet ikke at medføre behov for begrænsning af anvendelsen af naboarealer.	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Find råstofområder		X	Projektområdet overlapper ikke med udlagte råstofområder, og projektet vil derfor ikke udgøre en hindring for anvendelsen af sådanne områder[14].	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Find kystnærhedszonen		X	Kystnærhedszonen er en planlægningszone langs kysten, der typisk strækker sig ca. 3 km fra strandkanten og dækker landzone og sommerhusområder langs Danmarks kyster. Projektet er placeret i byzone og ligger således ikke inden for denne zone[15]. Der i Københavns Kommunes Kommuneplan 2024 op retningslinjer for den kystnære byzone, som omfatter Gerbrandskolen. Heraf fremgår, at fremtidige bebyggelses-forhold skal udformes under hensyn til samspillet med kystlandskabet, samtidig med at der tages det fornødne hensyn til den infrastruktur, der har behov for en placering ved kysten, og til at sikre offentligheden adgang til kysten. Det aktuelle projekt strider ikke imod denne retningslinje.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet forudsætter ingen rydning af skov, da området er byzone og indeholder ingen arealer, der opfylder kriterierne for skov som defineret i lovgivningen.	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Find verserende fredningssager		X	Der er ikke registreret verserende fredningssager inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet ved Gerbrandsvej 9. Projektet vurderes derfor ikke at være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.	
31. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelses-lovens § 3. Find beskyttede naturtyper			Nærmeste beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er registrerede eng- og mosearealer ca. 2,2 km vest for projektområdet samt strandeng ca. 3,0 km sydvest for projektområdet (målt i luftlinje). På baggrund af afstanden vurderes projektet ikke at påvirke § 3-beskyttede naturtyper	

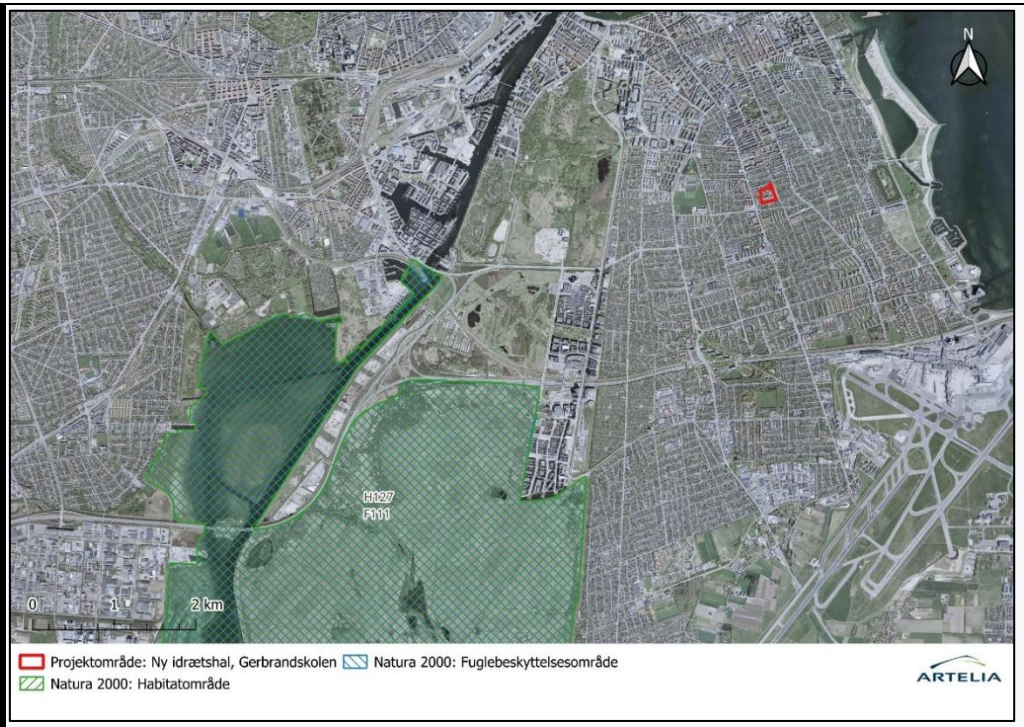
[14] Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal – Arealinformation. Tema: Råstofområder.

				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ Beskyttede arter – Miljøministeriet Arter.dk Naturdata – Danmarks Miljøportal	X		Der er i forbindelse med projektet gennemført skrivebordskortlægning og feltbesigtigelse af matr.nr. 3875 Sundbyøster, København med henblik på vurdering af eventuel forekomst af beskyttede arter, herunder arter omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser samt EU's habitatdirektivs bilag IV-arter. Kortlægningen viser, at der ikke er registreret beskyttede arter inden for selve projektområdet. Nærmeste registreringer af bilag IV-arter i området omfatter flagermusarter, herunder brunflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus og pipistrelflagermus, registreret i en afstand af ca. 800 m fra projektområdet. Derudover er der i nærområdet registreret de nationalt fredede arter skrubtudse og lille vandsalamander. På baggrund af feltbesigtigelse vurderes projektområdet som et intensivt anvendt bynært idrætsareal bestående af græsflader, boldbaner og randbeplantning. Der er	

			identificeret enkelte ældre træer i randzoner, hvor der i ét tilfælde ikke kan udelukkes potentiel egnethed som rasteområde for flagermus, mens hovedparten af beplantningen vurderes uegnet som yngle- eller rastehabitat. Den samlede vurdering i det faglige notat er, at risikoen for væsentlig påvirkning af bilag IV-arter er lav, forudsat at eksisterende træer i randzoner ikke beskadiges eller fjernes. Det planlagte lysanlæg til kunstgræsbanen er projekteret med henblik på at begrænse spildlys og reducere påvirkning af de omkringliggende arealer mest muligt. Projektørerne er specificeret med en farvetemperatur på max. 3000K, hvilket indebærer en reduceret andel af kortbølget/blåt lys sammenlignet med traditionelle sportsbelysningsanlæg med højere farvetemperaturer. Kortbølget lys vurderes generelt at være mest forstyrrende for nataktive arter, herunder flagermus. Herudover er der anvendt asymmetriske projektører med begrænsede kipvinkler på henholdsvis 5° og 15°, hvilket medvirker til at fokusere lyset på selve boldbanen og reducere lysudbredelsen til de omkringliggende områder. Masterne er 9 m høje, og belysningen er projekteret således, at spildlys uden for banen begrænses mest muligt. De udførte lysberegninger viser, at det potentielle træområde vest for banen alene strejfes perifert af lysniveauer på ca. 1,88–2,58 lux (lux er måleenhed for, hvor meget lys, der rammer en overflade). Til sammenligning er lysniveauet på en overskyet dag i størrelsesordenen 100 lux, mens tusmørke er i niveauet 1-10 lux. Belysningen kan samtidig dæmpes, således at de højeste lysniveauer alene anvendes i forbindelse med kampe eller særlige aktiviteter. Lysanlægget er således projekteret med fokus på at begrænse lysudbredelsen uden for boldbanen gennem anvendelse af varmtonet belysning, asymmetrisk lysfordeling og begrænsede kipvinkler. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af potentielle yngle- eller rasteområder for flagermus eller flagermusenes økologiske funktionalitet, jf. habitatdirektivets bilag IV-bestemmelser.	

33. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Find fredede områder		Sundbyvester Park er det nærmeste fredede område i forhold til projektområdet ved Gerbrandskolen. Afstanden i luftlinje fra projektområdet til det fredede område er ca. 770 meter i nordvestlig retning[16].  	

[16] Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal – Arealinformation. Tema: Fredede områder.

34. Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ Natura-2000 områder – Miljøstyrelsen Ramsarkonventionen – Miljøstyrelsen		 Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område N143, som består af habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111[17]. Begge områder ligger ca. 3,5 km sydvest for projektområdet ved Gerbrandskolen. Udpegningsgrundlag for H127 og F111 fremgår af nedenstående tabeller.	

[17] Miljøstyrelsen. Natura 2000-plan 2022-2027 for område N143 Vestamager og havet syd for.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 127		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klitlavning (2190)	Kransnålalge-sø (3140)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111		
Fugle:	Skarv (T)	Rørdrum (Y)
	Knopsvane (T)	Bramgås (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Troldand (T)	Lille skallesluger (T)
	Stor skallesluger (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Vandrefalk (T)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Almindelig ryle (Y)	Brushane (Y)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-område N143 er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som indgår i områdets udpegningsgrundlag, herunder naturtyper omfattet af habitatdirektivets bilag I samt arter omfattet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Projekter må ikke medføre forringelse af naturtyper og levesteder eller påvirke arterne negativt, så opfyldelsen af bevaringsmålsætningerne hindres.

Habitatområde H127 er beliggende ca. 3,5 km sydvest for projektområdet. Projektet omfatter etablering af idrætshal og udendørs idrætsanlæg i et eksisterende byområde og medfører ikke emissioner eller hydrologiske ændringer, som kan

			påvirke habitatområdets naturtyper eller arter. På baggrund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområde H127 eller hindre opfyldelsen af områdets bevaringsmålsætninger. Fuglebeskyttelsesområde F111 er beliggende ca. 3,5 km sydvest for projektområdet. En væsentlig del af udpegningsgrundlaget omfatter træk- og rastefugle tilknyttet kystnære naturtyper. Projektområdet er beliggende i tæt byområde og inddrager ikke raste- eller fourageringsområder for disse arter. Lokale ynglefuglearter udpeget i fuglebeskyttelsesområdet forventes ikke at forekomme i projektområdet på grund af afstanden og manglende habitatmæssig sammenhæng. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F111.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Se mål og tilstand i målsatte vandområder		X	Projektet ved Gerbrandskolen omfatter etablering af idrætshal og kunstgræsbane i et eksisterende byområde og forventes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af overfladevand eller grundvand. Det fremgår af byggeprogrammet, at grundvandet i området i perioder kan stå i eller tæt ved terrænniveau, særligt i vinterperioder og ved større nedbørshændelser. Der forventes ikke væsentlig påvirkning af grundvandsforholdene som følge af projektet. Projektet indebærer ikke direkte udledning til vandløb, søer eller kystvande og medfører ikke fysiske ændringer af nærliggende vandområder. Regnvand fra tag- og befæstede arealer håndteres via lokal afledning og det eksisterende afvandingssystem i området. Projektet vurderes på den baggrund ikke at medføre forringelse af tilstanden i nærliggende vandforekomster eller hindre opfyldelse af miljømål i vandområdeplanerne[18].	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser (OSD)? Find OSD		X	Projektområdet ved Gerbrandskolen ligger ikke inden for et område, der er kategoriseret som område med drikkevandsinteresser (OSD)[19]. Der gennemføres derudover ikke aktiviteter i hverken anlægs- eller driftsfasen, som kan påvirke drikkevandsinteresser negativt.	

[18] Miljøministeriet. MiljøGIS / Danmarks Miljøportal – Vandområders tilstand og miljømål, jf. vandområdeplanerne.
[19] Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal – Arealinformation. Tema: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Find data om jordforurening	X		Projektområdet ved Gerbrandskolen, hvor idrætshal og kunstgræsbane etableres, er ikke kortlagt som forurenet på vidensniveau V1 eller V2. Et tilstødende areal inden for matrikel 3875 er kortlagt som V2 (forurenet jord), og dette kortlagte område grænser direkte op til projektområdet. Eventuel jordhåndtering i forbindelse med anlægsarbejdet skal ske i overensstemmelse med gældende regler for klassificering, håndtering og bortskaffelse af jord i Københavns Kommune.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommune-planen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Projektområdet ved Gerbrandskolen er ikke beliggende inden for et område, der i Københavns Kommuneplan 2024 er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Projektet vurderes derfor ikke at være særligt sårbart over for oversvømmelse eller at medføre væsentlig påvirkning af oversvømmelsesrisikoen. Regnvand håndteres i overensstemmelse med gældende krav og retningslinjer for klimatilpasning.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Find risikoområder		X	Projektområdet ved Gerbrandskolen ligger uden for alle udpegede risikoområder for oversvømmelse i henhold til oversvømmelsesloven[20]. Der forventes derfor ingen risiko for oversvømmelse af projektområdet under normale forhold.	

Kumulative og grænseoverskridende miljøpåvirkninger.			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Projektet ved Gerbrandskolen etableres i et eksisterende byområde på Amager med skole- og idrætsanvendelse samt boligområder i nærområdet. Der vurderes ikke at være større samtidige anlægsprojekter i umiddelbar nærhed, som i væsentlig grad kan medføre kumulative miljøpåvirkninger sammen med det ansøgte projekt. Eventuelle kumulative effekter vurderes primært at kunne relatere sig til midlertidige påvirkninger i anlægsfasen i form af støj, støv og trafik i et lokalt byområde, hvor tilsvarende aktiviteter allerede forekommer. Samlet vurderes der ikke at være væsentlige kumulative miljøpåvirkninger.

[20] Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal / Arealinformation – Udpegede risikoområder for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Projektet er lokaliseret ved Gerbrandskolen i Københavns Kommune, og alle forventede miljøpåvirkninger som følge af anlæg og drift vil være uvæsentlige og lokale. Der forventes ingen påvirkning af nabolande.	

Tilpasninger af projektet inden ansøgning.		
42. Indsæt beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektet ved Gerbrandskolen er udformet med hensyntagen til de lokale miljø- og planforhold, herunder nabobebyggelse, eksisterende skole- og idrætsanvendelse samt gældende kommunale retningslinjer for støj, overfladevand og anlægsarbejder. Projektets udformning er baseret på følgende tilpasninger og forebyggende foranstaltninger: • Sportsbelysningen ved kunstgræsbanen er projekteret med særlige lysbegrænsende tiltag med henblik på at reducere påvirkning af naboer og omgivelser. Dette omfatter anvendelse af asymmetriske LED-projektører, begrænsede kipvinkler (5° og 15°), master på 9 m, mulighed for driftsmæssig dæmpning samt dokumenteret begrænsning af spildlys til omkringliggende opholdsarealer. De udførte lysberegninger viser spildlysniveauer ved nærmeste naboarealer på ca. 0,18–1,88 lux ved maksimal drift, hvilket vurderes ikke at medføre væsentlige lysgener. • Placering og disponering af idrætshal og kunstgræsbane er tilpasset skolens eksisterende struktur og omgivelser med henblik på at minimere påvirkning af nærliggende boliger. • Projektet indpasses i det eksisterende byrum med hensyntagen til afstande, adgangsforhold og eksisterende aktivitetsniveau i området. • Håndtering af overfladevand fra tagflader og befæstede arealer indgår i projektets afvanding, således at afledning sker kontrolleret i overensstemmelse med Københavns Kommunes krav til klimatilpasning og lokal håndtering af regnvand.

		• Anlægsarbejder planlægges udført inden for Københavns Kommunes forskrift for støjende og støvende bygge- og anlægsaktiviteter, herunder fastlagte arbejdstider og begrænsning af særligt støjende aktiviteter. • Kunstgræsbane og idrætsfaciliteter er dimensioneret og placeret på baggrund af støjberegninger, således at påvirkningen af omkringliggende boliger reduceres inden for de anvendte vejledende vurderingsrammer. Yderligere miljømæssige hensyn kan blive indarbejdet i den videre projektering og myndighedsbehandling, såfremt dette vurderes relevant.	

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Vejledning

Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Udfyldning af skemaet: Alle hvide felter er tekstfelter, hvor der kan/skal leveres oplysninger. I forhold til Miljøvurderingsreglerne krydses der af i felterne "Ja" eller "Nej" og suppleres med tekst, hvor dette er nødvendigt og relevant. Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan forventes at have begrænset eller ubetydelig påvirkning (grøn), begrænset eller nogen påvirkning (gul) eller forventet væsentlig påvirkning af miljøet (rød). Myndigheden (som oftest kommunen) vurderer de anmeldte oplysninger i forhold til krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM) og træffer efterfølgende afgørelse om dette.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.
