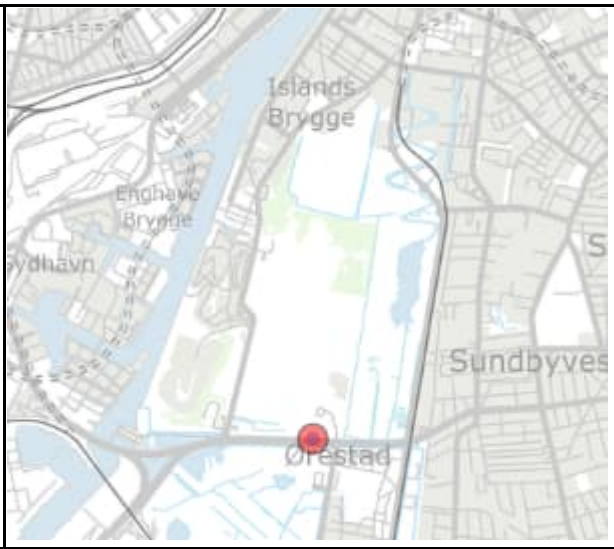
Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Rørlægning af 34 m af Hovedgrøften Syd langs Vejlands Allé i forbindelse med anlæggelsen af en ny adgangsvej til det nye boligområde Fælledby, og forlængelse af en eksisterende rørlægning med 10 m i forbindelse med udvidelse af den eksisterende adgangsvej. Den nye rørlægning får en dimension på Ø1000 mm, mens forlængelsen af den eksisterende rørledning får en diameter på Ø600 mm som nuværende forhold. I begge rør anlægges bundlag som forlængelse af bunden i den eksisterende grøft. Arbejdsgange og udførsel er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fælledby P/S c/o Cobblestone A/S Gammel Køge Landevej 57, 3 2500 Valby CVR: 40741860 info@faelledby.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Baltser Fælledby P/S Vejlands Allé 200 2300 København S Tlf.: 6023 7560 mbt@faelledby.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Vejlands Allé 200 2300 København S Matr.nr. 1aa og matr.nr. 409 Eksercerpladsen, København
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Københavns Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Projekttegning 0 viser begge rørlægninger, projekttegning 1 viser ny kortlægning og projekttegning 2 viser princip for ny rørlægning.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: pkt. 13, litra a, om ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matr.nr. 1aa langs Vejlands Allé er ejet af Københavns Kommune, hvor rørlægning på 34 m etableres. Del af matr.nr. 409, hvor rørlægning på 10 m etableres, er ejet af Fælledby P/S (overtaget fra By & Havn).		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Området vil fremover være anvendt som beskrevet i gældende miljøkonsekvens-vurdering. Der er ingen bebyggelse. Det befæstede areal er omfattet af gældende VVM-tilladelse, og udvides ikke.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Samlet 44 m rørlægning af Hovedgrøften Syd. Der er ikke behov for grundvandssænkning, men vandløbsvand overpumpes i anlægsperioden. Grundareal er 34 x 1 + 10 x 0,6 = 40 m2. Ingen bebyggelse. Ingen nye befæstede arealer.		

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	10 m betonrør Ø600 og 34 m betonrør Ø1000, nøddesten, geotekstil, bigbags med sand, friktionsmateriale. Alle materialer i relativ begrænset mængde, begrundet i projektets mindre omfang. Ikke behov for anvendelse af vand på arbejdspladsen. Bundlag i begrænset mængde under rør opgraves og bortkøres til jordmodtager. Ingen spildevand fra anlægsarbejder. Personale anvender velfærdsfaciliteter i Fælledby.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen brug af hverken råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vand i driftsfasen. COWI har lavet en hydraulisk analyse som underbygger at rørlægningen ikke medfører nogen opstuvning. De hydrauliske modelleringer viser at rørlægningen har en kapacitet på mindst 150 l/s, jf. "Kapacitetsanalyse ved underføring af Hovedgrøften Syd. Cowi, 2. april 2025", som er vedlagte ansøgningsmaterialet fra ansøgning om rørlægning.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der er ikke affald eller spildevand i driftsfasen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Bygge- og anlægsforskrift i København.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Projektet medfører ikke særligt støjende arbejder.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der håndteres ikke støvende materialer i anlægsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet ligger i den kystnære byzone ca. 1 km fra kysten. Projektet etableres under terræn og vil ikke være synligt efter anlæggelse. Adgangsvej skal placeres i dette område og kan ikke flyttes.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			40 m til Nordre Landkanal og 350 m til overdrev på Amager Fælled.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er kendskab til forekomst af særligt beskyttede og fredede padder og krybdyr på Amager Fælled generelt. Området er derfor undersøgt som beskrevet i bilag og fundet uegnet for ynglende og rastende padder, herunder stor vandsalamander og spidssnudet frø.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			6 m til fredningen af Kalvebodkilen (Vejlands Allé).
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1,4 km. Der er hydraulisk forbindelse til Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for, når der er sydgående strøm i Københavns Havn (ca. 39 % af tiden). Ved at sikre at projektet ikke medfører ophvirvling af sediment eller erosion, undgås risikoen for en påvirkning af Natura 2000-området. I forbindelse med overpumpning af vandet i anlægsfasen forbi arbejdsarealet med de nye rørlægninger, sikres det, at der ved udledning igen af vandet til Hovedgrøften Syd ikke sker ophvirvling og erosion, ved f.eks. at udlægge sten eller andre faste og stabile materialer, som vandet rammer ved udledningen.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Hovedgrøften Syd ændres fysisk ved rørlægning på to strækninger af 10 og 34 meters længde, ved at en åben grøft ændres til en rørlagt grøft på de konkrete strækninger. Ellers ingen påvirkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Matrikler er registreret som forurenet som følge af den tidligere losseplads på arealerne. Opgravet materiale afskaffes til godkendt modtager.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er ikke planlagte aktiviteter i nærområdet ud over opførsel af Fælledby, der er miljøkonsekvensvurderet og udstedt § 25 tilladelse til efter miljøvurderingsloven. Rørlægningen er en selvstændig projektændring uden teknisk forbindelse til opførelsen af Fælledby. Opførelse af Fælledby vil ikke have en kumulativ

			miljømæssig påvirkning på rørlægningen, ligesom rørlægningen ikke vil have en kumulativ påvirkning på opførelse af Fælledby. Det bemærkes, at Københavns Kommune den 26. juni 2025 traf en screeningsafgørelse om tre projektændringer omfattende øget jordhåndtering, udgravning af bassiner og øget grundvandssænkning i Fælledby. Screeningsafgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagesagen verserer fortsat. Det bemærkes ligeledes, at Københavns Kommune den 10. april 2026 traf en screeningsafgørelse om ændret terrænregulering ved byggefelt C1 og B7 som følge af hævning af parkeringsplintene. Rørlægningen og projektændringerne er ikke teknisk forbundne og kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Arbejdsområderne er fysisk adskilt og beliggende i hver sin ende af det samlede projektområde, idet rørlægningen består af en i alt 44 m lang røroverkørsel, som etableres i kanaltracéet i Hovedgrøften Syd, og projektændringerne om den ændrede jordhåndtering samt terrænregulering omfatter opgravningsarbejder og grundvandssænkning i selve byggefelterne og modningsområderne. Der er ikke fysisk overlap mellem arbejdsområderne. Rørlægningen og projektændringerne påvirker heller ikke hinandens funktionalitet, idet rørlægningen alene vedrører vandføringsevnen i Hovedgrøften Syd, hvorimod projektændringerne om ændret jordhåndtering samt terrænregulering vedrører det terrænnære grundvand, håndtering af lossepladsfyld og forurenet jord. Miljøpåvirkningerne rammer endvidere forskellige recipienter. Rørlægningens potentielle påvirkning er begrænset til de hydrauliske forhold i Hovedgrøften Syd, hvor påvirkningen er beregnet til at ligge under modelusikkerheden. Jordhåndteringen påvirker det terrænnære grundvand og jordmatricen i byggefelterne, hvor oppumpet grundvand vil blive afledt til kloak, ikke til vandløb. Der er således ingen fælles recipient, og projekternes miljøpåvirkninger kan ikke forstærke hinanden. Der vil således ikke være en kumulativ påvirkning på rørlægningen fra projektændringerne, ligesom rørlægningen ikke vil have en kumulativ påvirkning på projektændringerne om ændret jordhåndtering samt terrænregulering.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			I forbindelse med overpumpning sikres det, at der ikke forekommer ophvirvling eller erosion i Hovedgrøften Syd. Overpumpning medfører samtidig, at der ikke er mulighed for ophvirvling af materiale fra vandløbsbunden i forbindelse med gravearbejder. Ved at sikre at projektet ikke medfører ophvirvling af sediment eller erosion, undgås risikoen for en påvirkning af Natura 2000-området. I forbindelse med overpumpning af vandet i anlægsfasen forbi arbejdsarealet med de nye rørlægninger, sikres det, at der ved udledning igen af vandet til Hovedgrøften Syd ikke sker ophvirvling og erosion, ved f.eks. at udlægge sten eller andre faste og stabile materialer, som vandet rammer ved udledningen. Ny vandløbsbund i rørlægning etableres med vaskede nøddesten, svarende til anbefalet materiale til gydegrus, så ophvivling af materiale ikke kan forekomme.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____19.06.2026_____ Bygherre/anmelder:_____Martin Baltser_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
